




โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พริ้ว) ตอน 1 จ.ปทุมธานี 1.750 กม.
กม.0+000.00 ถึง กม.1+750.00

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2569

แนวเส้นทางและตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ



แนวเส้นทางและตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ

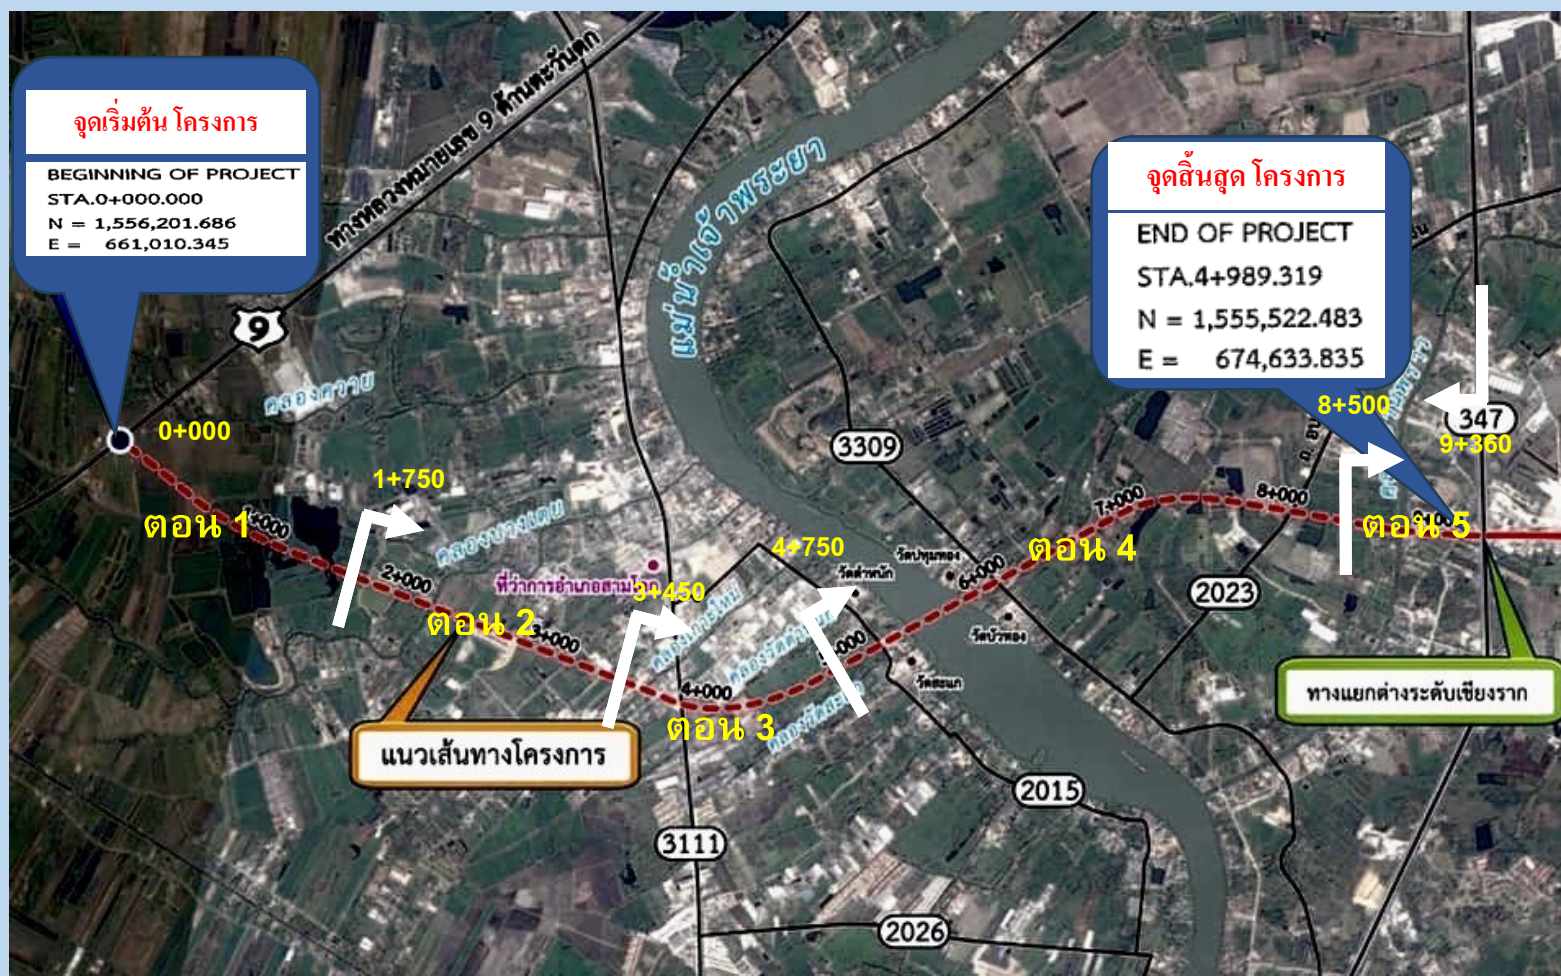



ความก้าวหน้า


รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ผลงานก่อนหน้า	แผนงาน	ผลงาน	ผลงาน	ผลงาน	%ผลงาน
		ทั้งหมด	ก.ย. 67-มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ก.ค.-69	สะสม	คงเหลือ	
2.1 CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	101,000.00	72,735.32	7,575.00	0	72,735.32	28,264.68	72.01%

ยังไม่มีผลงานเพิ่ม ในเดือน ก.ค.69



ความก้าวหน้า

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ผลงานก่อนหน้า	แผนงาน	ผลงาน	ผลงานสะสม	ผลงาน	%ผลงาน
		ทั้งหมด	ก.ย. 67-มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ก.ค.-69		คงเหลือ	
2.3(2) SAND EMBANKMENT	CU.M.	262,000.00	109,131.70	13,100.00	9,221.13	118,352.83	143,647.17	45.17%

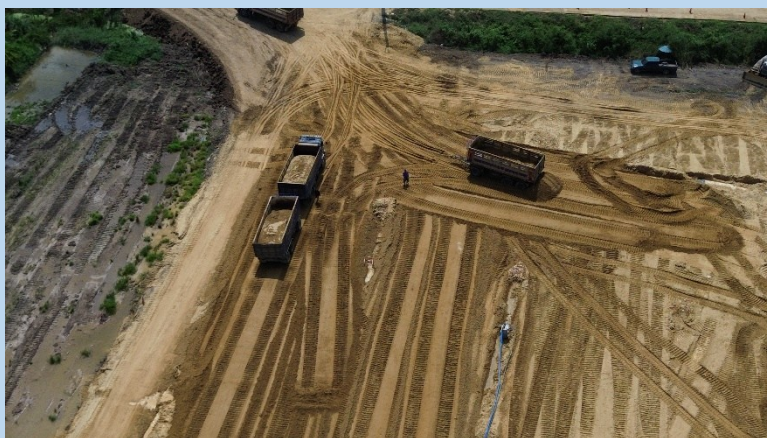



ความก้าวหน้า

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	ผลงานก่อนหน้า ก.ย. 67-มี.ย.-69	แผนงาน ก.ค.-69	ผลงาน ก.ค.-69	ผลงานสะสม	ผลงานคงเหลือ	%ผลงาน
2.3(11.5) VACUUM CONSOLIDATION METHOD	SQ.M.	15,918.00	9,550.8	795.90	1,591.800	11,142.600	4,775.400	70.00



คำอธิบาย : ภาพดำเนินงานอ่านค่าเครื่องมือวัด Instrument installation บริเวณ BL1-1 ถึง BL1-3



คำอธิบาย : ภาพดำเนินงานอ่านค่าเครื่องมือวัด Instrument installation บริเวณ BL1-1 ถึง BL1-3





ความก้าวหน้า

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	ผลงานก่อนหน้า ก.ย. 67-มิ.ย.-69	แผนงาน ก.ค.-69	ผลงาน ก.ค.-69	ผลงาน สะสม	ผลงาน คงเหลือ	%ผลงาน
5.1(1.1) RAMP 1 ROADWAY WIDTH 10.00 M. SKEW -'								
- SEGMENT RAMP 1	EACH.	187.00	122	30	35	157	30	83.9%
- SEGMENT RAMP 2	EACH.	148.00	48	30	29	77	71	52.02%





ความก้าวหน้า

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	ผลงานก่อนหน้า ก.ย. 67-มิ.ย.-69	แผนงาน ก.ค.-69	ผลงาน ก.ค.-69	ผลงาน สะสม	ผลงาน คงเหลือ	%ผลงาน
5.1(1.1) RAMP 1 ROADWAY WIDTH 10.00 M. SKEW -'								
- งานฐานราก	ฐาน.	15	1	4	5	6	8.7	58%



หมายเหตุ

- 1= ขุดเปิดหลุม 10%
- 2= เทดิน, ตัดเข็ม 20%
- 3= ผูกเหล็ก 20%
- 4= เข้าแบบ 20%
- 5= เทคอนกรีต 20%
- 6= ถอดแบบ 10%

A1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	A15
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ดำเนินการ

ความก้าวหน้า

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	ผลงานก่อนหน้า ก.ย. 67-มิ.ย.-69	แผนงาน ก.ค.-69	ผลงาน ก.ค.-69	ผลงาน สะสม	ผลงาน คงเหลือ	%ผลงาน
5.1(1.1) RAMP 4 ROADWAY WIDTH 8.00 M. SKEW -'								
- งานฐานราก	ฐาน.	13	3	4	0	3	10	23.07%



หมายเหตุ

- 1= ขุดเปิดหลุม 10%
- 2= เทลีน, ตัดเข็ม 20%
- 3= ผูกเหล็ก 20%
- 4= เข็มแบบ 20%
- 5= เทคอนกรีต 20%
- 6= ถอดแบบ 10%

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	A13
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

ดำเนินการแล้ว

ยังไม่ดำเนินการ



ความก้าวหน้า


รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ผลงานก่อนหน้า	แผนงาน	ผลงาน	ผลงาน	ผลงาน	%ผลงาน
		ทั้งหมด	ก.ย. 67-มิ.ย.-69	ก.ค.-69	ก.ค.-69	สะสม	คงเหลือ	
5.1(12.1) BORED PILE DIA. 0.60. M.	HOLE.	103.000	80	7	0	80	23	77.60
5.1(12.2) BORED PILE DIA. 0.80. M.	HOLE.	59.00	45	4	0	45	0	100.00
5.1(12.3) BORED PILE DIA. 1.20. M.	HOLE.	37.000	33	2	0	33	4	89.19
5.1(12.4) BORED PILE DIA. 1.50. M.	HOLE.	10.000	6	1	0	6	4	60.00






ความก้าวหน้า เสาเข็มเจาะ


RAMP 1



RAMP 2




RAMP 4

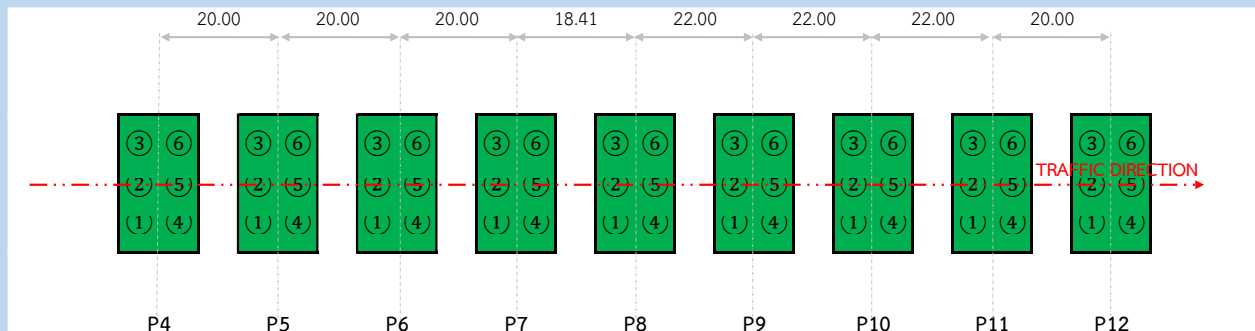

ปัญหาและอุปสรรค

ลำดับ	รายการ	หมายเหตุ
1	ที่ดินแปลง 22 ยังไม่ได้พื้นที่ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างสะพาน RAMP 2 **อยู่ระหว่างรอประชุมกำหนดเงิน	พื้นที่โดยรวมทั้งโครงการ ได้พื้นที่มาแล้วประมาณ 80%

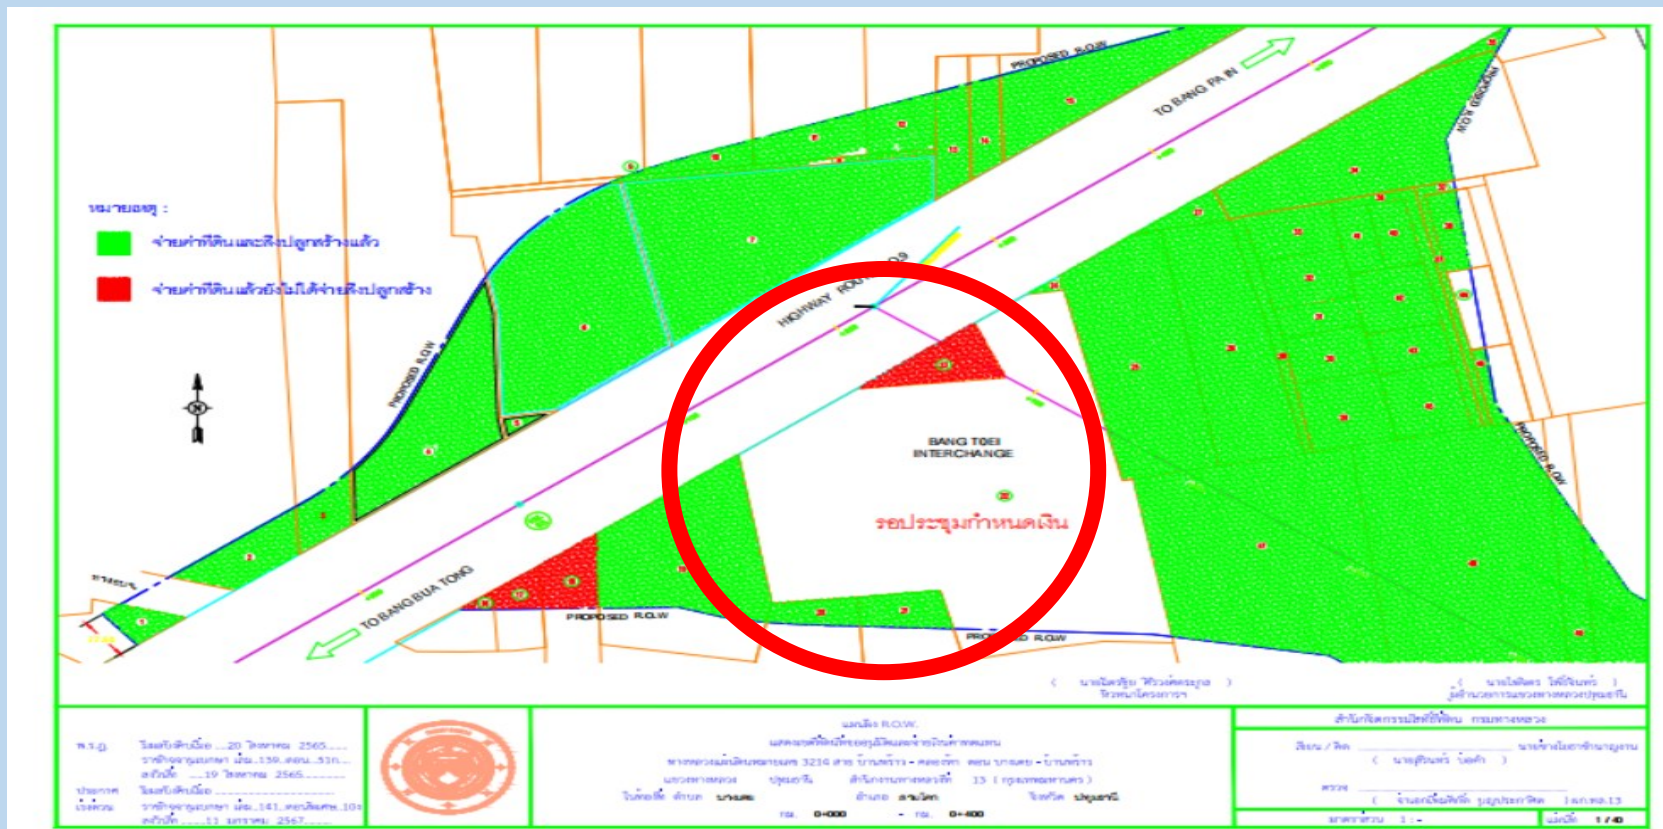



ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรค			
	ตอน1		
รายการ	ปัญหาและอุปสรรค	หนังสือ อนุมัติ	รวม.
งาน Sand Embankment	1.บ่อทราย		
	การจ่ายเงินบ่อทราย		ปฐุมศิริโชค
	การจ่ายเงินบ่อทราย		มหาทรัพย์ ขนส่ง
	2.ชุดบดอัดทรายถม		
	การจ่ายเงินงวดงาน ชุดบดอัดทรายถม		ทีไอซีพี
งาน Bored Pile	ติดปัญหาพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ได้รับมอบจากกรมทางหลวง		เทวี & CK
	รวม.ต้องการย้ายออกไปก่อน		
งาน Concete Bridge	การจ่ายเงินงวดงาน		เคเคเคที กรุ๊ป
	การจัดซื้อคอนกรีตเข้าหน่วยงาน ให้ต่อเนื่อง		VCB
เงินสดย่อย	รายละเอียดตามแนบ		VCB
เงินตั้งเบิก (เงินโอน)	รายละเอียดตามแนบ		VCB



เอกสารแนบ

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

หน่วยงาน บางเตย (BT) ตอน1

รายการค้ำเบิก ชดเชยเงินสดย่อย

ที่	รายการค้ำเบิก ชดเชยเงินสดย่อย			
	หนังสือออกที่	ลงวันที่	งวดประจำวันที่	จำนวนเงิน
12	BT/บัญชี/09/028	17 มี.ค. 68	1-15 มีนาคม 68	5,371.96
13	BT/บัญชี/09/033	2 เม.ย. 68	16-31 มีนาคม 68	1,200.00
14	BT/บัญชี/09/034	2 เม.ย. 68	16-31 มีนาคม 68	3,842.00
15	BT/บัญชี/09/036	11 เม.ย. 68	1-15 เมษายน 68	833.96
16	BT/บัญชี/09/040	5 พ.ค. 68	16-30 เมษายน 68	6,356.66
26	BT/บัญชี/09/070	17 ก.ย. 68	1-15 กันยายน 68	6,138.96
29	BT/บัญชี/09/084	4 พ.ย. 68	16-31 ตุลาคม 68	4,305.21
30	BT/บัญชี/09/088	22 พ.ย. 68	1-15 พฤศจิกายน 68	14,113.50
31	BT/บัญชี/09/092	10 ธ.ค. 68	16-30 พฤศจิกายน 68	26,266.83
32	BT/บัญชี/09/097	22 ม.ค. 69	1-31 ธันวาคม 68	37,856.89
33	BT/บัญชี/09/099	5 ม.ค. 69	1-15 มกราคม 69	5,731.06
34	BT/บัญชี/09/101	3 ก.พ. 69	16-31 มกราคม 69	12,072.46
35	BT/บัญชี/09/106	17 ก.พ. 69	1-15 กุมภาพันธ์ 69	10,655.96
36	BT/บัญชี/09/113	4 มี.ค. 69	16-28 กุมภาพันธ์ 69	11,143.21
37	BT/บัญชี/09/114	17 มี.ค. 69	1-15 มีนาคม 69	9,016.31
38	BT/บัญชี/09/121	6 เม.ย. 69	16-31 มีนาคม 69	17,549.14
39	BT/บัญชี/09/122	21 เม.ย. 69	1-15 เมษายน 69	3,893.96
40	BT/บัญชี/09/125	6 พ.ค. 69	16-30 เมษายน 69	9,221.16
41	BT/บัญชี/09/126	16 พ.ค. 69	1-15 พฤษภาคม 69	11,423.54
42	เบิกชดเชยเงินสดย่อย ครั้งที่ 42	7 มิ.ย. 69	16-30 พฤษภาคม 69	22,451.96
43	เบิกชดเชยเงินสดย่อย ครั้งที่ 43	21 มิ.ย. 69	1-15 มิถุนายน 69	14,328.36
44	เบิกชดเชยเงินสดย่อย ครั้งที่ 44	5 ก.ค. 69	16-30 มิถุนายน 69	12,280.56
รวม				246,053.65

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

สรุปรายการค้ำเบิกเงิน สํารองค่าใช้จ่าย (เงินโอน) VCB

หน่วยงาน บางเตย (BT)

สรุปรายการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการฯ (ตั้งแต่ ตุลาคม 2567)

ลำดับ ที่	รายการค้ำเบิก			
	หนังสือออกที่	ลงวันที่	อธิบายรายการ	จำนวนเงิน
74	BT/บริหาร/01/031	22 ต.ค. 68	ขออนุมัติเบิกค่าเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพรถ 1 ขณ 8639	11,661.62
77	BT/บริหาร/01/032	14 พ.ย. 68	ขออนุมัติเบิกค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ 4 ขณ 5951 (กรมทางหลวง)	3,059.68
78	BT/บริหาร/01/034	18 พ.ย. 68	ขออนุมัติเบิกค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ 5 ขณ 4485 (กรมทางหลวง)	4,585.16
80	BT/บริหาร/01/035	8 ธ.ค. 68	ขออนุมัติเบิกค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศบ้านพักรับราชการ	12,480.00
81	BT/บริหาร/01/036	12 ธ.ค. 68	ขออนุมัติเบิกค่าชุดอุปกรณ์เครื่องนอนวิศวกร	6,285.50
83	BT/บริหาร/01/037	22 ธ.ค. 68	ขออนุมัติเบิกค่าค่าอะไหล่แถม (ท่อ)	9,050.00
84	BT/บริหาร/01/038	24 ธ.ค. 68	ขออนุมัติเบิกค่ารถเข้าศูนย์ 4 ขณ 5938 กรมทางหลวง	3,335.28
89	BT/บริหาร/01/039	14 ม.ค. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารถเข้าศูนย์ 1 ขณ 8639 ผู้จัดการโครงการฯ	5,686.72
90	BT/บริหาร/01/040	19 ม.ค. 69	ขออนุมัติเบิกค่าอะไหล่รถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน 50-1062	3,295.60
91	BT/บริหาร/01/041	22 ม.ค. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารถเข้าศูนย์ 5 ขณ 4482 กรมทางหลวง	3,163.99
92	BT/บริหาร/01/042	29 ม.ค. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารับรองคณะกรรมการตรวจรับงาน ม.ค. 69	10,993.00
93	BT/บริหาร/01/043	3 ก.พ. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารถเข้าศูนย์ 4 ขณ 5933 กรมทางหลวง	4,510.48
94	BT/บริหาร/01/044	3 ก.พ. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารถเข้าศูนย์ 4 ขณ 5935 กรมทางหลวง	4,510.48
96	BT/บริหาร/01/045	7 ก.พ. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารถเข้าศูนย์ 5 ขณ 4482 กรมทางหลวง	6,933.68
98	BT/บริหาร/01/046	21 ก.พ. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารถเข้าศูนย์ 4 ขณ 5942 กรมทางหลวง	3,423.68
102	BT/บริหาร/01/047	28 ก.พ. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารับรองคณะกรรมการตรวจรับงาน ก.พ. 69	9,268.00
108	BT/บริหาร/01/048	30 มี.ค. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารับรองคณะกรรมการตรวจรับงาน มี.ค. 69	7,431.00
111	BT/บริหาร/01/049	20 เม.ย. 69	ขออนุมัติเบิกค่าทดสอบเหล็กข้ออ้อย	7,000.00
113	BT/บริหาร/01/050	2 พ.ค. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารับรองคณะกรรมการตรวจรับงาน เม.ย. 69	11,082.00
115	BT/บริหาร/01/051	26 พ.ค. 69	ขออนุมัติเบิกค่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	5,853.00
117	BT/บริหาร/01/052	4 มิ.ย. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารับรองคณะกรรมการตรวจรับงาน พ.ค. 69	7,301.70
118	BT/บริหาร/01/053	12 มิ.ย. 69	ขออนุมัติเบิกค่ามัดจำค่าเช่ารถจักรยานยนต์	9,600.00
119	BT/บริหาร/01/054	21 มิ.ย. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารับรองอธิบดีกรมทางหลวงตรวจเยี่ยมโครงการฯ	7,470.22
120	BT/บริหาร/01/055	4 ก.ค. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารับรองคณะกรรมการตรวจรับงาน มิ.ย. 69	6,458.00
121	BT/บริหาร/01/056	9 ก.ค. 69	ขออนุมัติเบิกค่ารถเข้าศูนย์ 1 ขณ 8639 ผู้จัดการโครงการฯ	13,025.89
รวมเงิน				177,464.68
