



โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34
สายบางโฉลง-แยกหนองไม้แดง
ตอนบางโฉลง-บางวัว ตอน 6
ช่วง กม.36+000-กม.39+200
ระยะทางประมาณ 3.200 กิโลเมตร

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ : สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

มูลค่าโครงการ : 759,750,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง : 960 วัน


ระยะเวลาที่เหลือ : 628 วัน (21 เดือน)

วันเริ่มต้นสัญญา : 23 สิงหาคม 2568

วันสิ้นสุดสัญญา : 8 เมษายน 2571



ที่ตั้งโครงการ
อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา

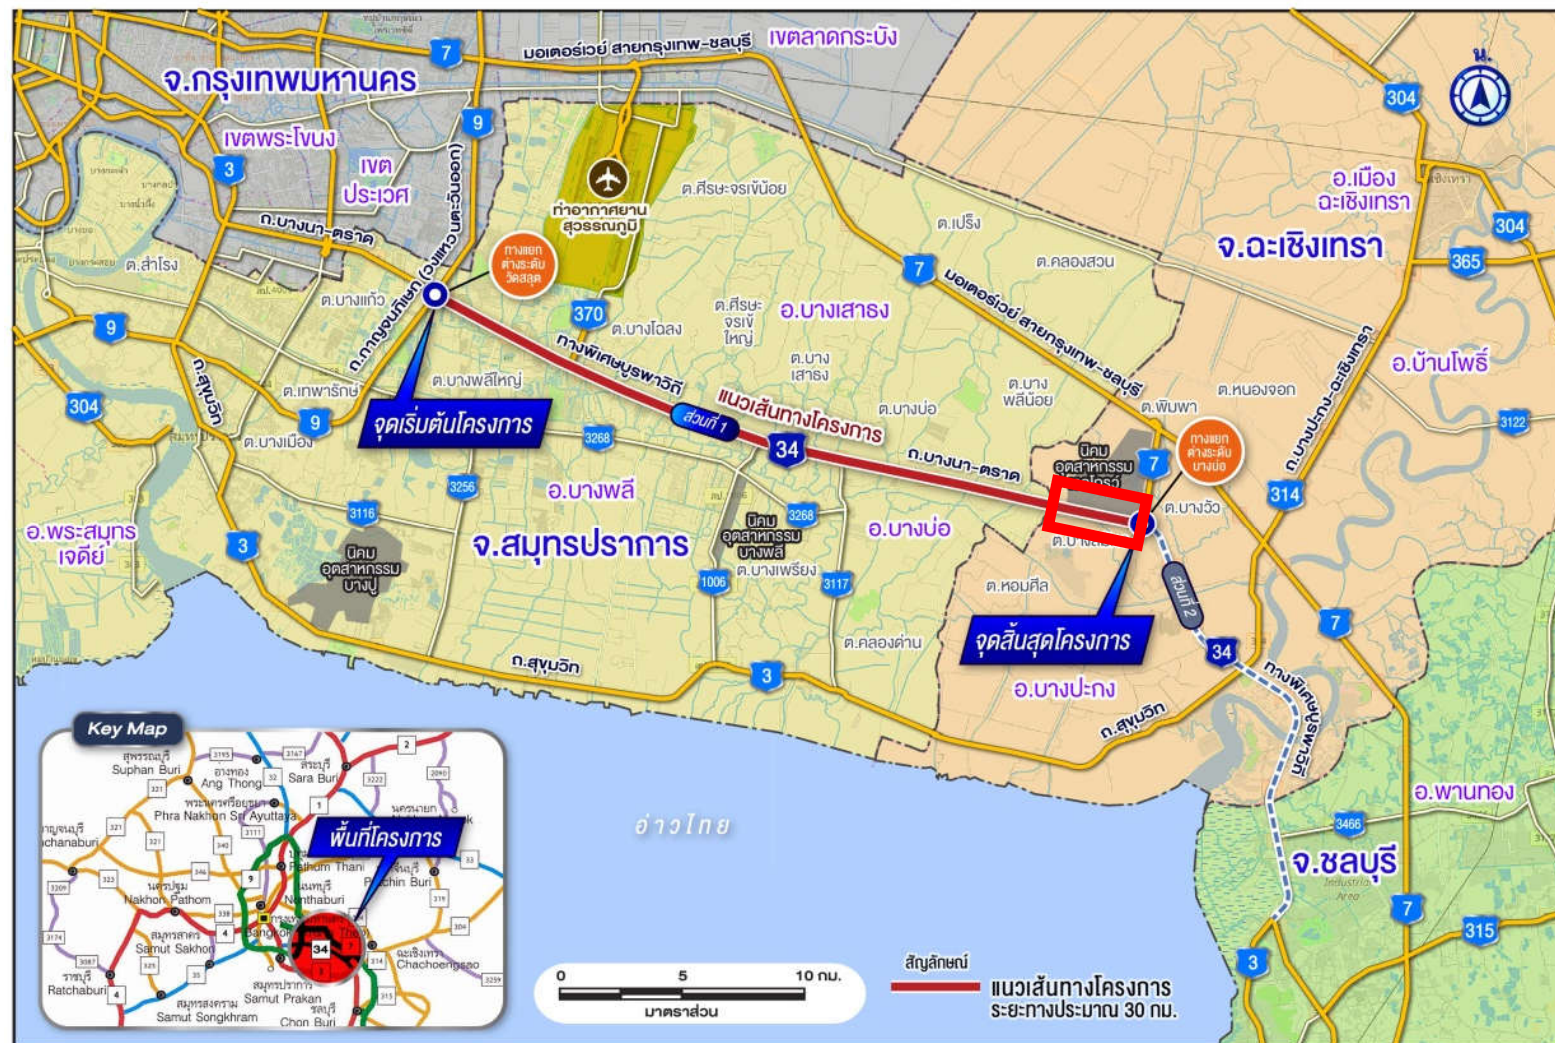

ความคืบหน้างานเตรียมการส่วนของบริษัทฯ



งานเตรียมการส่วนบริษัทฯ

- ♦ งานติดตั้ง Plant Concrete เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำ Mixed Design
- ♦ งานติดตั้ง Plant Asphaltic งานติดตั้งแล้วเสร็จ
- ♦ งานติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก รอบปรับปรุงคุณภาพ
- ♦ งานติดตั้งรั้วรอบ Plant เหลือด้านปิด Plant Asphaltic

งานติดตั้ง Plant Concrete



งานติดตั้ง Plant Asphaltic



ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ


8

- ♦ งาน Remove Concrete Barrier & Pipe Culvert
- ♦ งาน Clearing And Grubbing
- ♦ งาน Milling of Existing Asphalt Concrete Surface
- ♦ งาน Sand Embankment
- ♦ งาน Soil Aggregate Subbase
- ♦ งาน Box Culvert Side Drain Side 1-1.20x1.20 m.
- ♦ งาน Retaining Wall Type 2A
- ♦ งาน Precast Manhole Type E For Box Culvert 1.20 m.

Remove Concrete Barrier & Pipe Culvert



Milling of Existing Asphalt Concrete Surface

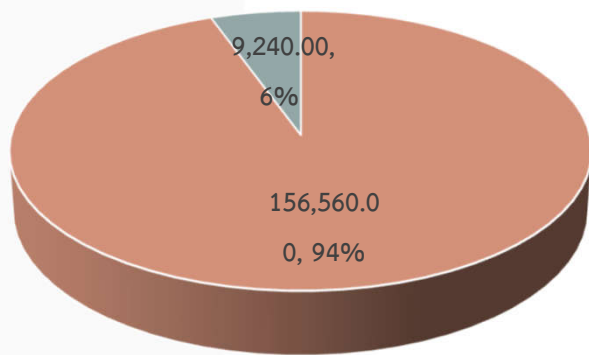

ปริมาณทั้งหมด
แล้วเสร็จ
คงเหลือ


165,800 ตร.ม.

9,240 ตร.ม.

156,560 ตร.ม.



Clearing And Grubbing

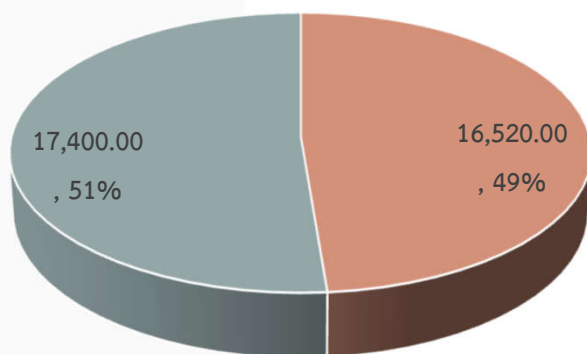

ปริมาณทั้งหมด
แล้วเสร็จ
คงเหลือ


33,920 ตร.ม.

17,400 ตร.ม.

16,520 ตร.ม.



Sand Embankment

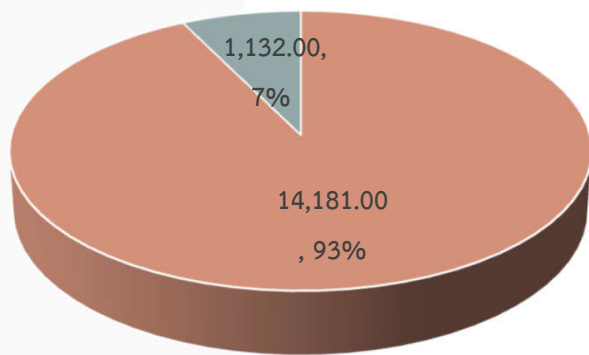


ปริมาณทั้งหมด
แล้วเสร็จ
คงเหลือ


15,313 ลบ.ม.

1,132 ลบ.ม.

14,181 ลบ.ม.

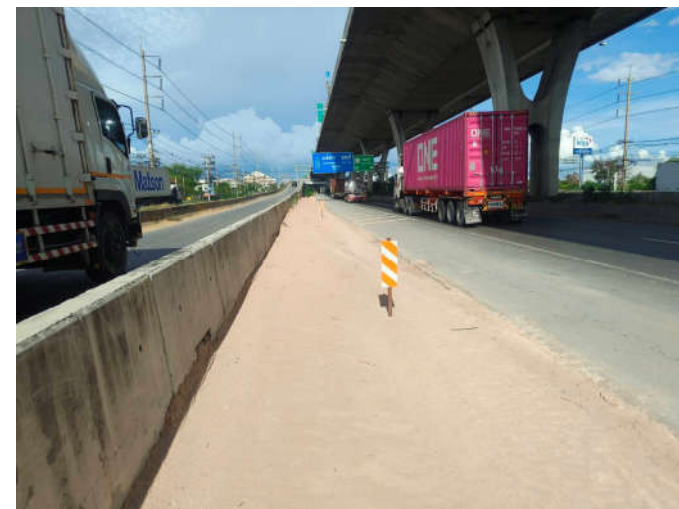

Soil Aggregate Subbase

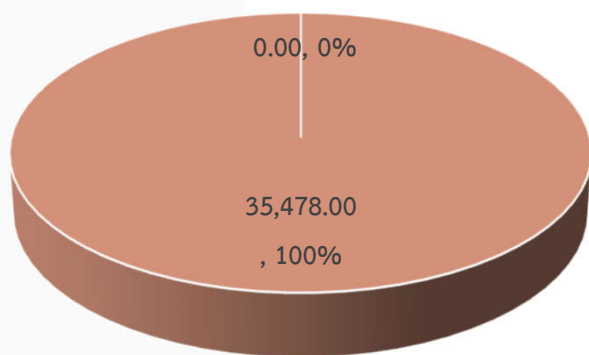


ปริมาณทั้งหมด
แล้วเสร็จ
คงเหลือ


35,478 ลบ.ม.

0 ลบ.ม.



35,478 ลบ.ม.

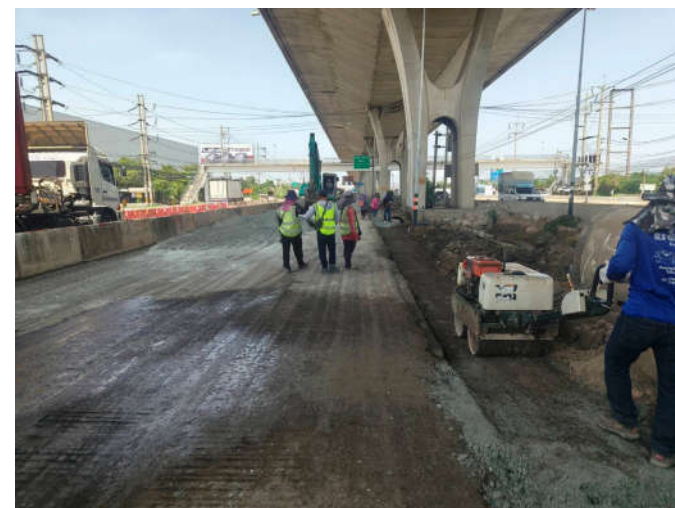


Box Culvert Side Drain Side 1-1.20x1.20 m.

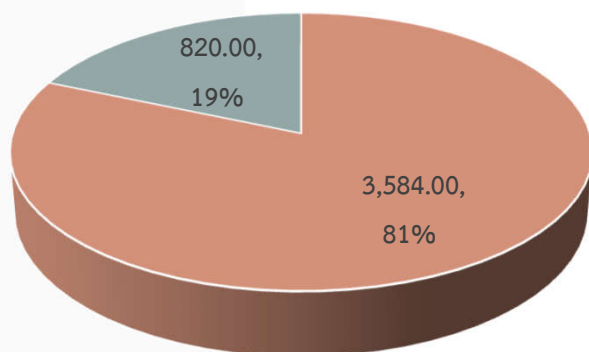


ปริมาณทั้งหมด 4,404 ม.
 แล้วเสร็จ 3,584 ม.
 คงเหลือ 820 ม.

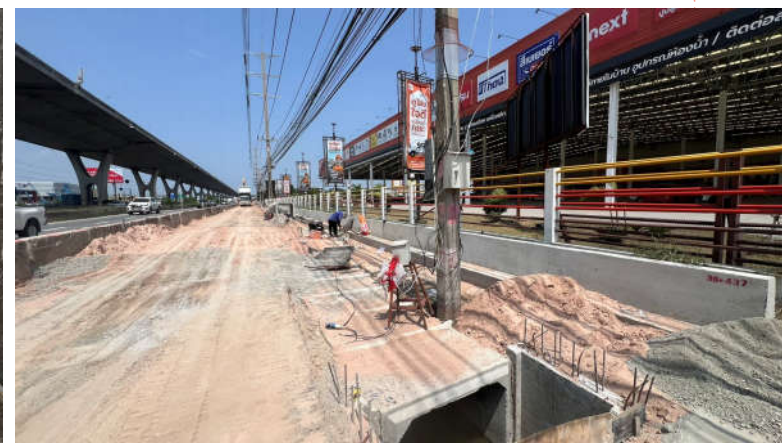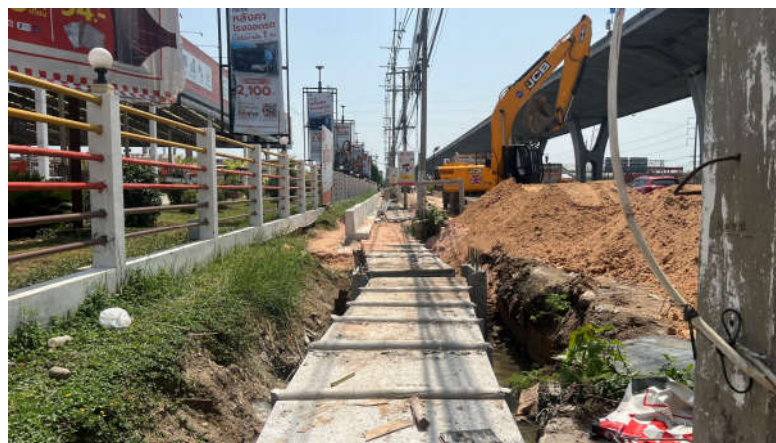

สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งท่อเหลี่ยมขนาด 1.20 ม.

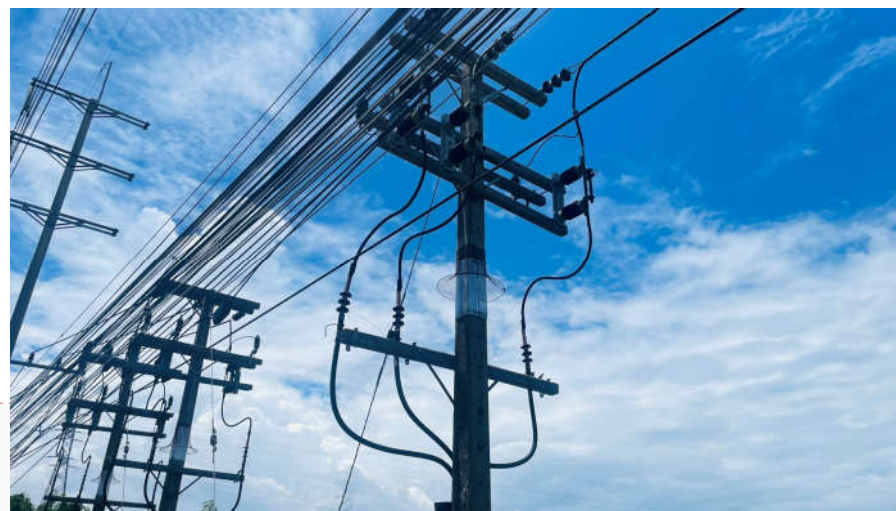

Retaining Wall Type 2A

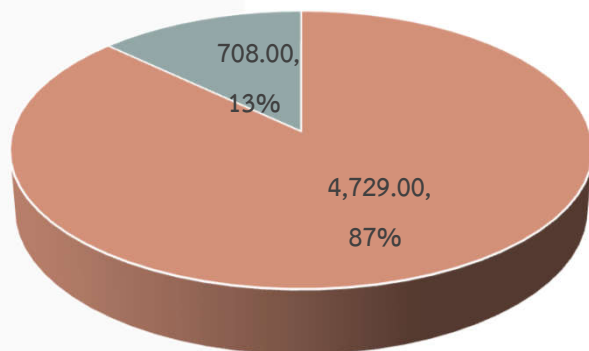


ปริมาณทั้งหมด
แล้วเสร็จ
คงเหลือ

5,437 m.
708 m.
4,729 m.



Precast Manhole Type E For Box Curvert 1.20 m.

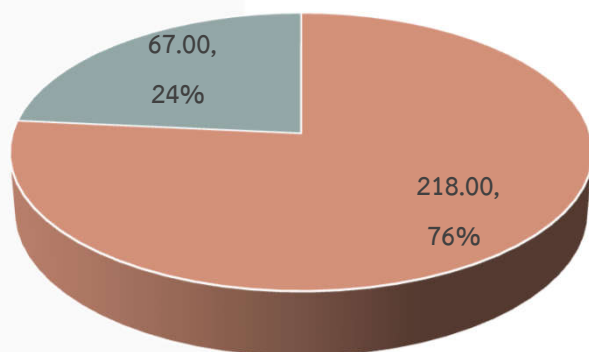

ปริมาณทั้งหมด
แล้วเสร็จ
คงเหลือ

285 Ea.
67 Ea.
218 Ea.



เรื่องแจ้งให้ทราบ

- ♦ ความก้าวหน้าโครงการ ผลงานสะสม 6.393% แผนสะสมงาน 17.532% ช้ากว่าแผนงาน -11.139% (มิ.ย.69)
- ♦ เดือนสิงหาคม 69 แผนงานสะสม 25.048% (อาจถูกตัดสิทธิ์ซื้อแบบ)
- ♦ ตามแผนงาน ผลงานสะสม จะน้อยกว่าแผนงานสะสม มากกว่า -15% ติดกันประมาณ 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.69)
- ♦ งานเบี่ยงจราจรเพื่องานก่อสร้าง
 - ♦ งานถนนเบี่ยงทางหลักฝั่งขาออก ได้ 2 ช่องจราจร ใช้ทางได้ 1 ช่องจราจร (เบี่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 - ♦ งานสะพานบกปิดเบี่ยงได้ทั้งหมด แต่ต้องมีช่องจราจรสวนทาง (อยู่ระหว่างทำ Detour Road)
 - ♦ งานเบี่ยงถนนคู่ขนานฝั่งขาเข้า กม.38+100-39+200 เบี่ยงเพิ่มจากเดิม 1 ช่องจราจร เป็น 2 ช่องจราจร เพื่อเริ่มงานขยายถนน
- ♦ งานเสาเข็มตอก อยู่ระหว่างพิจารณาราคาจ้างเหมา
- ♦ งานเสาเข็มเจาะ ได้รับอนุมัติแล้ว (ผู้รับเหมาขอปรับราคา เนื่องจากราคาน้ำมัน)
- ♦ เครื่องชั่งน้ำหนักวัสดุ แผ่นเหล็กที่ใช้ซ่อมส่งเข้ามาแล้ว รอช่างเชื่อมจาก สาย 5
- ♦ Plant Asphaltic ยังขาดถึงเก็บน้ำยาง Prime Coat และถึงเก็บน้ำยาง Tack Coat
- ♦ ส่งผลงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 6 ก.ค.69 เบิกค่างานได้ 22.49 ล้านบาท


ปัญหาและอุปสรรค

- ◆ พนักงานที่เชี่ยวชาญ Plant Asphaltic เสียชีวิต และไฟร์แมน Plant ขอเกษียณอายุ
- ◆ พชร.รถชุด ขาด 2 ตำแหน่ง ,พชร.รถบรรทุก ขาด 2 ตำแหน่ง , พชร.รถแทรกเตอร์ ขาด 1 ตำแหน่ง
- ◆ รถบรรทุกสิบล้อ มี 5 คัน ไม่เพียงพอ (เสีย 1 คัน) , รถผสมคอนกรีต มี 1 คัน ไม่เพียงพอ (รอเปลี่ยนยาง)
- ◆ รถบริการอายุการใช้งานกว่า 10 ปี ต้องเปลี่ยนช่วงล่าง ,ระบบเบรกและคลัตช์ ,ยางรถยนต์
- ◆ เครื่องจักร เสียบ่อยครั้ง ต้องใช้เงินสต็อกซื้ออะไหล่ และต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องจักร (กรอง,เล็บ,ใบมีด,ยาง)
- ◆ สะพานข้ามคลองทั้ง 3 สะพาน สะพานเดิมไม่ตรงตามแบบ อยู่ระหว่างโครงการฯส่งเรื่องแก้ไขแบบ (ทำเรื่องขอสงวนสิทธิ์)
- ◆ งานวางท่อเหลี่ยม 1.20 ม. กม.38+025-38+075 ติดแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน วางแนวหลบแนวไฟฟ้า
- ◆ งานวางท่อเหลี่ยม 1.20 ม. กม.36+900-38+050 ติดแนวท่อประปาใต้ดิน 2 ท่อ ทำเรื่องเร่งรัดผ่านโครงการ
- ◆ งานวางท่อเหลี่ยม 1.20 ม. กม.36+900-38+500 ติดแนวท่อสายเคเบิลใต้ดิน แจ้ง NT เข้าตรวจสอบช่วงขุดวางท่อ
- ◆ งานขยายถนนทางหลักฝั่งขาออกมีท่อระบายน้ำเดิม ต้องใช้รถสกัดคอนกรีตและรถบรรทุกขนถ่ายเศษคอนกรีตและท่อระบายน้ำเดิมออก


เพิ่มทรัพยากรเพื่อเร่งรัดงาน

20

- ♦ เพิ่มป้ายจราจรชั่วคราว อุปกรณ์จราจร Barrier พลาสติก ,กรวยยาง ,ไฟเตือน ,ไฟแสงสว่าง และสายไฟฟ้า
- ♦ เพิ่มเครื่องจักรงานถนน 1 ชุด (รถเกรดเดอร์ รถบด รถน้ำ) สำหรับงานขยายถนนทางหลักขาออก และคูขนานขาเข้า
- ♦ เพิ่มรถชุด 2 คัน สำหรับงานชุดเปิดถนนบางนาเพื่อทำสะพานบก ผึ่งขาออก และสำหรับเพิ่มกรรม.งานวางท่อผึ่งขาเข้า
- ♦ รถบรรทุกสิบล้อต้องมีครบ 10 คัน ตามแผน เพื่อรองรับงานชุดเปิดถนน ,งานชุดดินวางท่อ และรองรับงานปูยาง
- ♦ รถผสมคอนกรีตต้องมีครบ 4 คัน ตามแผน และรับพนักงานขับรถเพิ่ม
- ♦ เพิ่มรถปูยางแบบล้อยาง เพื่อช่วยปูงานหินคลุกผสมซีเมนต์ ลดภาระรถเกรดเดอร์ และสำรองงานปูยาง
- ♦ ปรับเวลาการทำงานของพนักงาน เป็นเวลา 7.00 น.-18.00 น.
- ♦ สรุปรู้รับเหมาเสาเข็มตอก และผู้รับเหมาเสาเข็มเจาะ เพื่อเริ่มงานให้เร็วที่สุด
- ♦ เพิ่มชุดผู้รับเหมาหรือเพิ่มคนงานผู้รับเหมาเดิม ให้รองรับงานสะพานบก ,งาน Curb&Gutter และ Barrier Type 1
- ♦ เร่งเอกสารประกอบกิจการของ Plant Asphaltic ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน
- ♦ เร่งซ่อมเครื่องจักรงานปูยาง หรือหาผู้รับเหมางานปูยางพร้อมเครื่องจักร
- ♦ งานปูยางสำหรับงานขยายถนน ต้องปูยางให้จบ 2 ชั้น (20 ซม.) จึงเบี่ยงจราจรกลับ

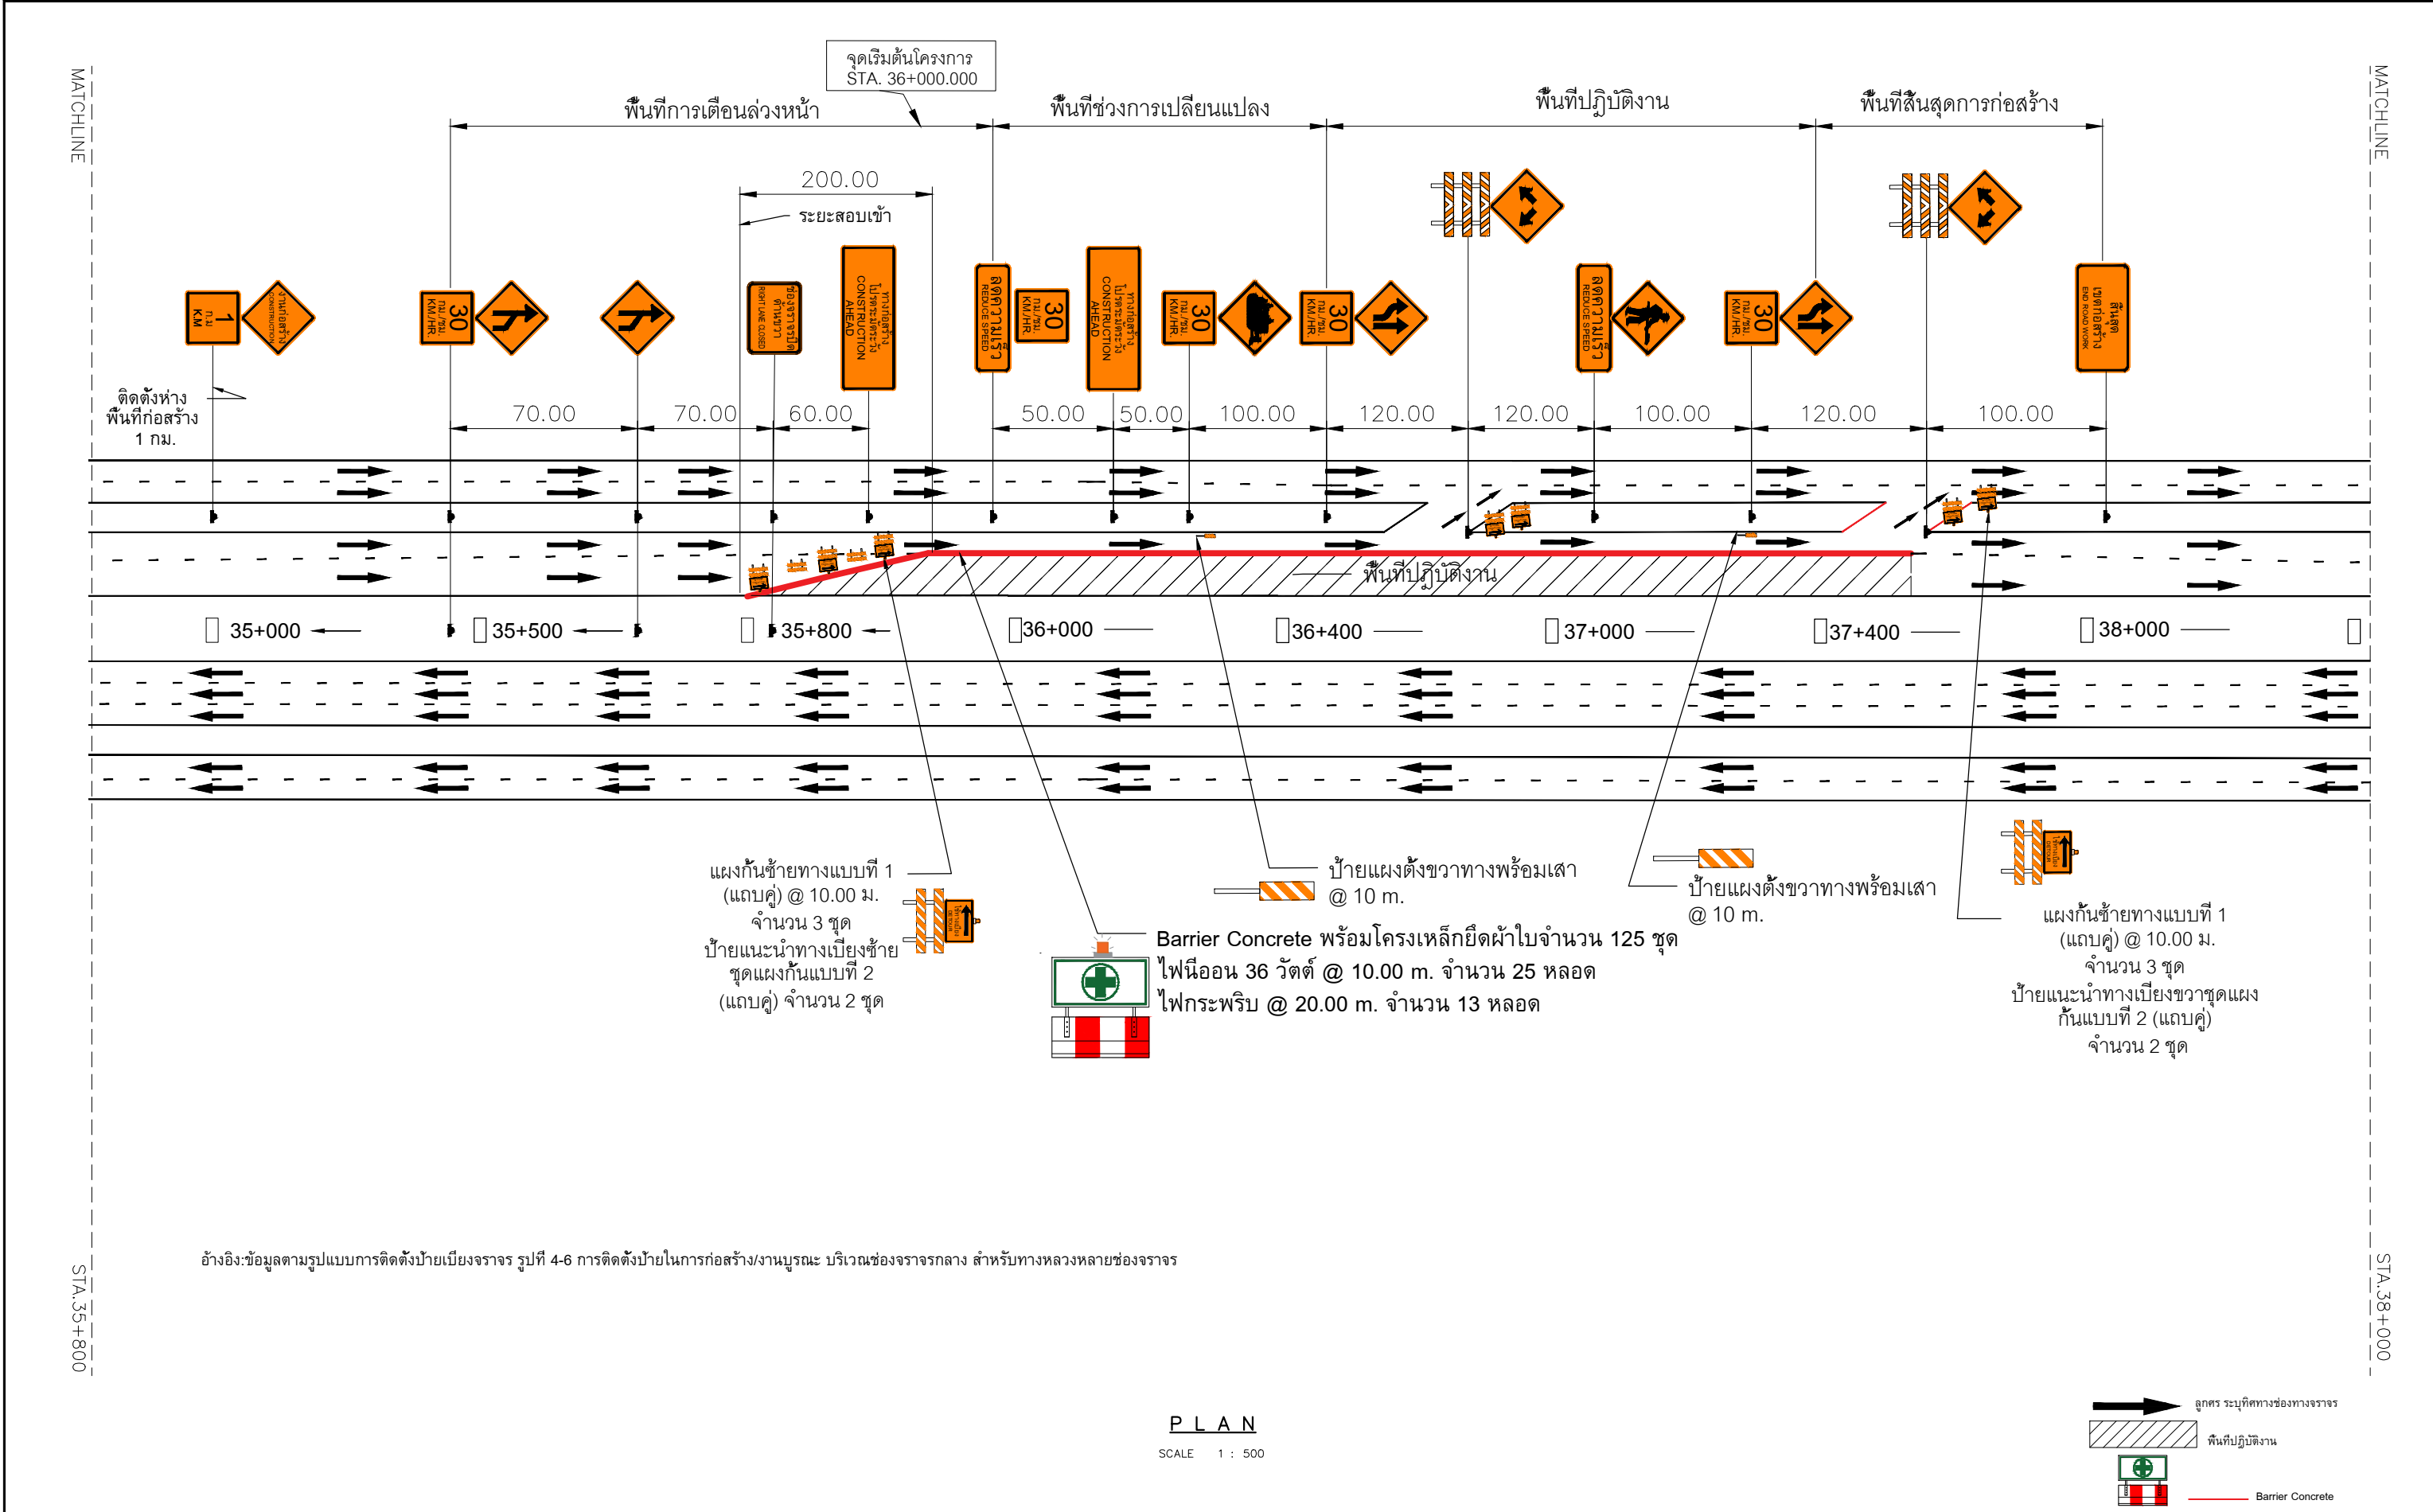

Revision	Date	Description	Drawn by	Checked by	Project : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สายบางไผ่ – แยกหนองไผ่แดง ตอนบางไผ่ – บางบัว ตอน 6 (ช่วง กม. 36+000.000 - 39+200.000)					
FIRST ISSUE	26/06/2569	SHOP DRAWING	B. Pitack Ch.	B. Witsarut Approve by	 KINGDOM OF THAILAND MINISTRY OF TRANSPORT DEPARTMENT OF HIGHWAYS	 Contractor : VICHITBHAN CONSTRUCTION CO., LTD.	Title : TRAFFIC MANAGEMENT MAIN LINE PLAN LAYOUT STA. 35+600.000 - 37+100.000			
							Drawing No. –	File Name –	Scale AS SHOWN	Sheet No. 1
			S. Chaovalit							

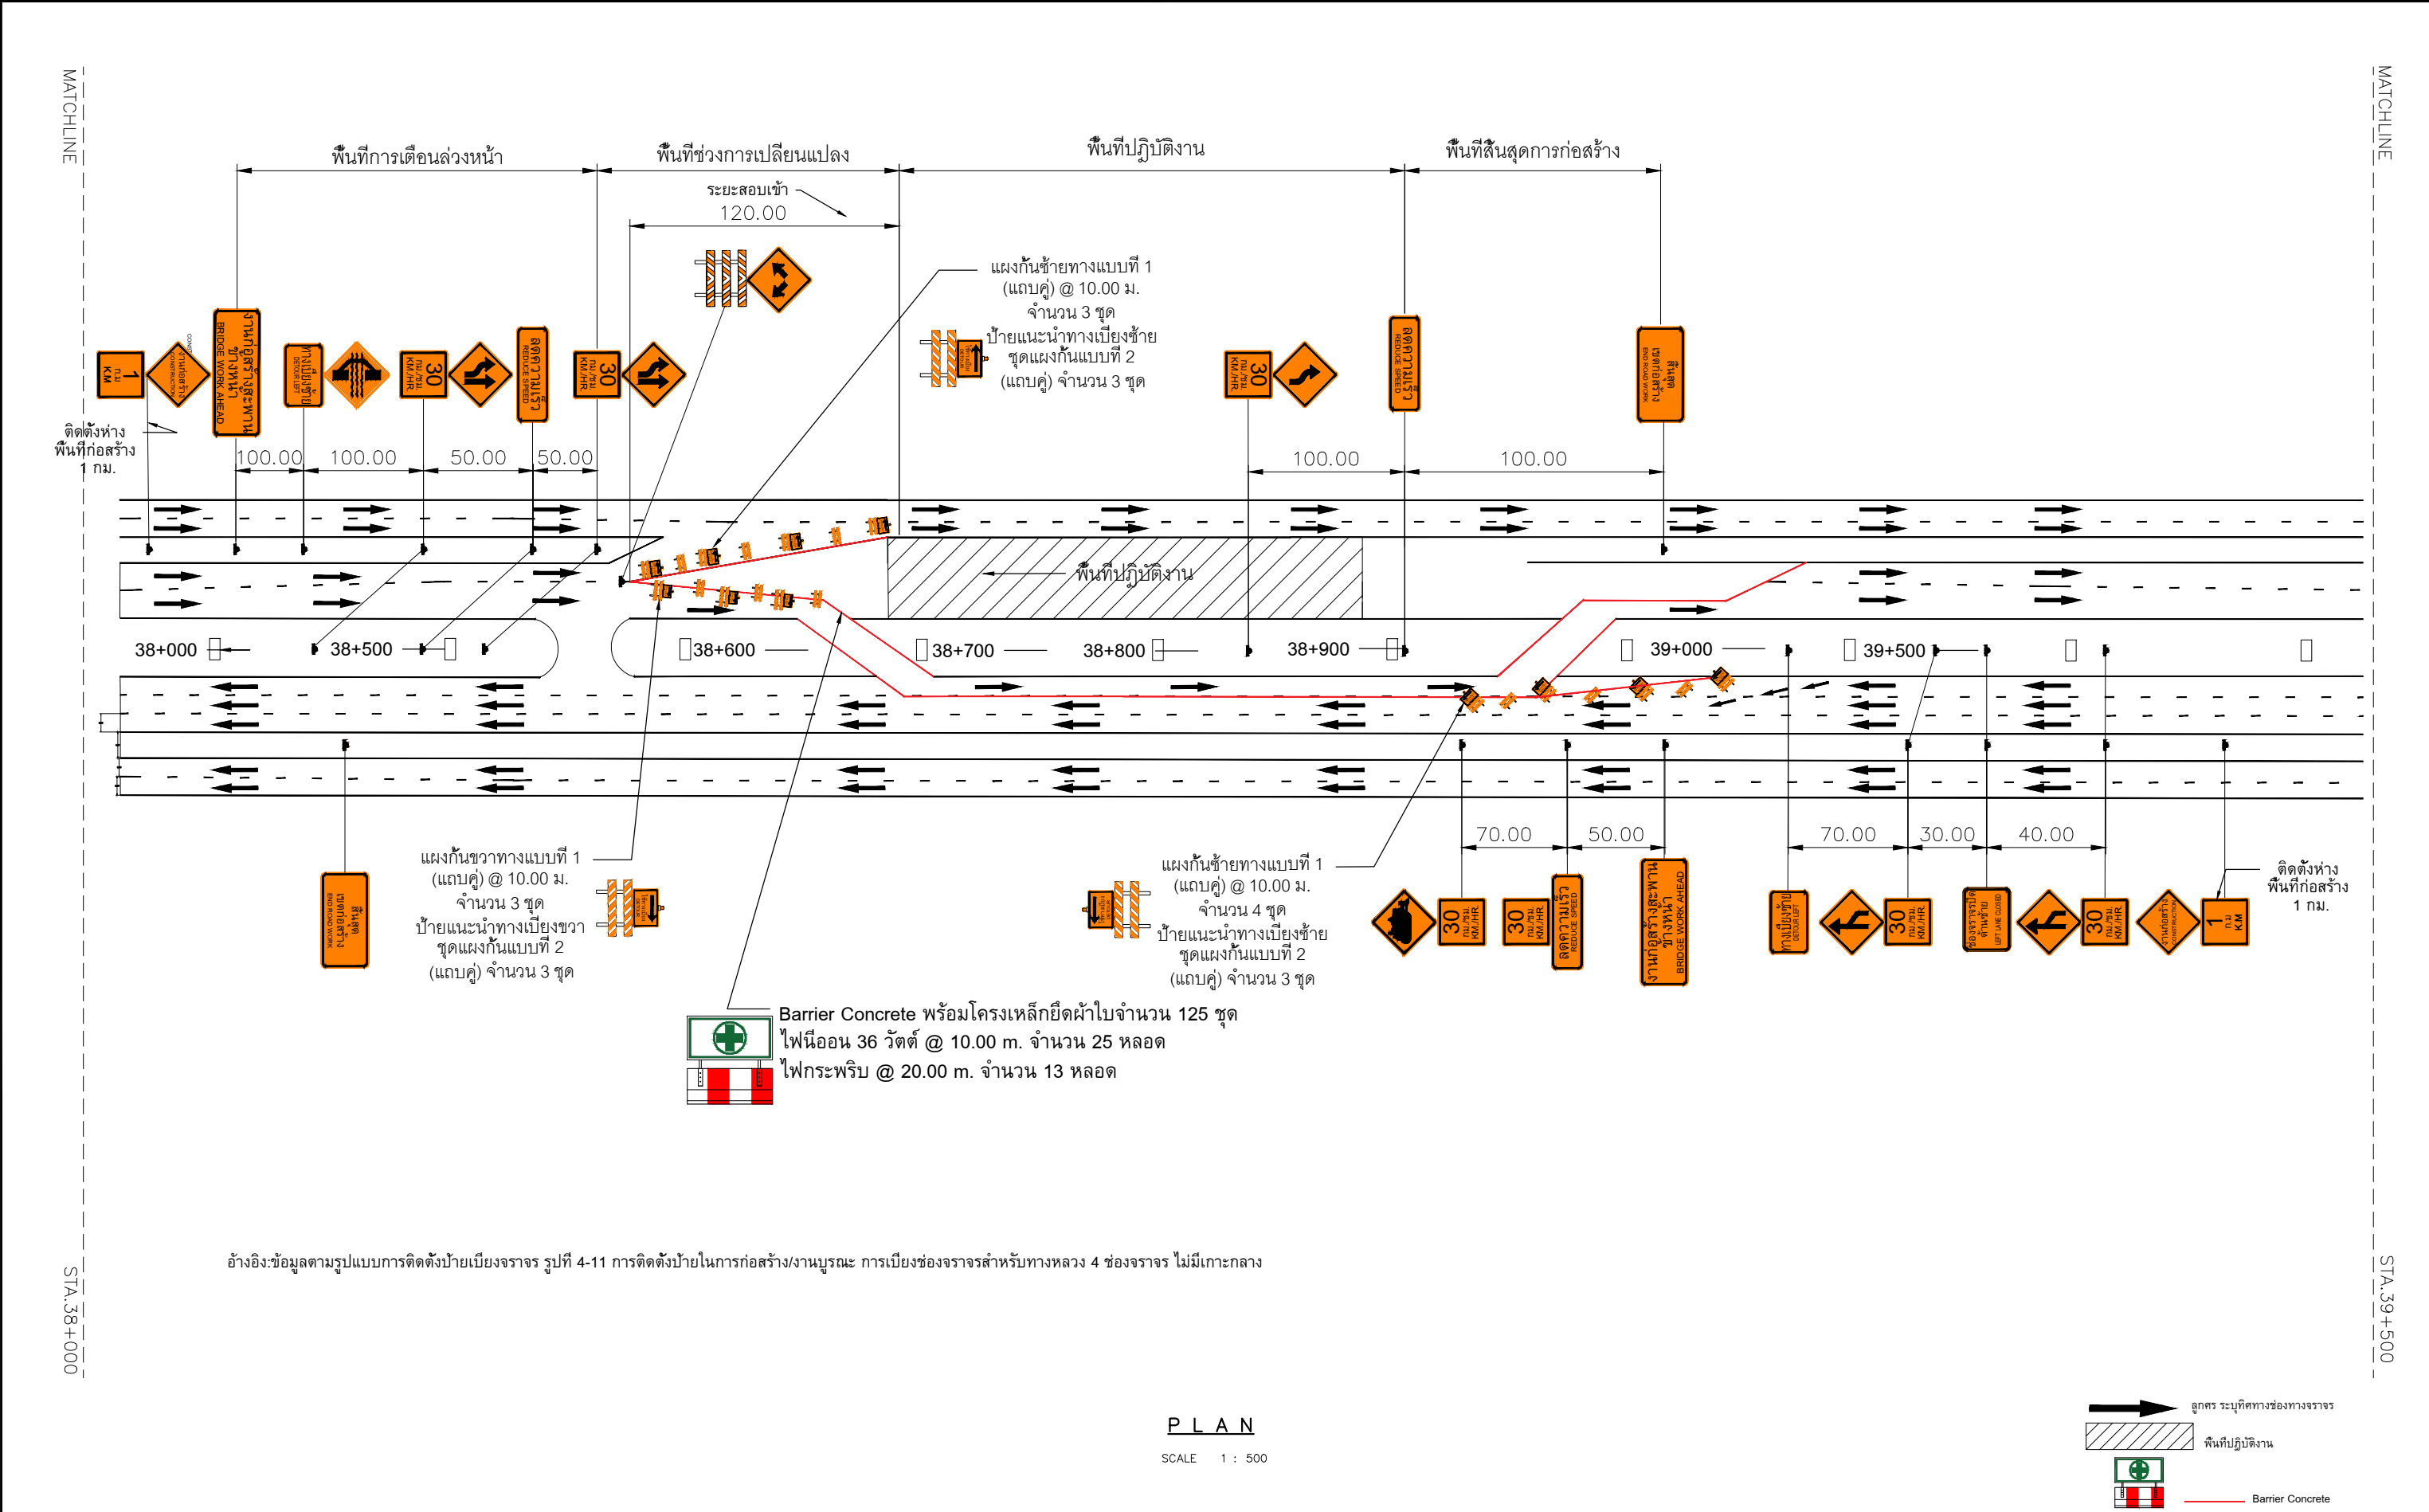

อ้างอิงข้อมูลตามรูปแบบการติดตั้งป้ายเบี่ยงจราจร รูปที่ 4-11 การติดตั้งป้ายในการก่อสร้าง/งานบูรณะ การเบี่ยงช่องจราจรสำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลาง

P L A N

SCALE 1 : 500

Revision	Date	Description	Drawn by	Checked by	Project : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34 สายบางไผ่-บางเลน – แยกหนองไผ่แดง ตอนบางไผ่ – บางบัว ตอน 6 (ช่วง กม. 36+000.000 - 39+200.000)			
FIRST ISSUE	26/06/2569	SHOP DRAWING	B. Pitack Chitpitak Ch.	B. Witsaru Witsaru	Employer : KINGDOM OF THAILAND MINISTRY OF TRANSPORT DEPARTMENT OF HIGHWAYS		Contractor : VICHITBHAN CONSTRUCTION CO., LTD.	
				Approve by			Title : TRAFFIC MANAGEMENT MAIN LINE PLAN LAYOUT STA. 35+000.000 - 39+100.000	
				S. Chaovale Chaovale				
					Drawing No.	File Name	Scale	Sheet No.
					-	-	AS SHOWN	AS SHOWN



บริษัท วิจิตรภานท์ก่อสร้าง จำกัด
Vichitbhan Construction Co., Ltd

ที่ BV/DOH/๐๗๓/๒๕๖๙

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔
สายบางโหลง- แยกหนองไม้แดง
ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔
สายบางโหลง-แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖
เลขที่รับ..... 128/2569
วันที่..... 18-7-69
เวลา..... 11:00 น.

เรื่อง ขอสงวนสิทธิต่อขยายอายุสัญญา

เรียน ชค.สท.๒ สายบางโหลง-แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖

อ้างถึง สัญญาที่ สท.๒/๔๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแปลนสะพาน กม.๓๖+๐๘๖.๑๘๙ จำนวน ๒ แผ่น
๒. แบบแปลนสะพาน กม.๓๗+๐๙๓.๘๘๗ จำนวน ๑ แผ่น
๓. แบบแปลนสะพาน กม.๓๘+๑๑๙.๕๑๗ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักก่อสร้างทางที่ ๒ กรมทางหลวงเป็น“ผู้ว่าจ้าง” ได้ว่าจ้างบริษัท วิจิตรภานท์ ก่อสร้าง จำกัด เป็น“ผู้รับจ้าง” ทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔ สายบางโหลง-แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖ ระหว่าง กม.๓๖+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๙+๒๐๐.๐๐๐ รวมระยะทางยาว ๓.๒๐๐ กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๖๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๗๕๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๘๙๙,๓๗๕.๐๐ บาทนั้น

บริษัทฯ ได้สำรวจพื้นที่การก่อสร้างโครงการฯ พบว่าโครงสร้างสะพานบางส่วน ไม่เป็นไปตามแบบในคู่สัญญาที่ระบุไว้ ดังนี้

๑. สะพาน กม.๓๖+๐๘๖.๑๘๙ (LT. Main Line) สะพานเดิมเป็น Slab Type ตามแบบในคู่สัญญา เป็นสะพาน Plank Girder Span $(๑ \times ๒.๐๐) + (๑ \times ๑๐.๐๐) + (๑ \times ๗.๐๐) = ๒๔.๐๐$ เมตร
๒. สะพาน กม.๓๗+๐๙๓.๘๘๗ (LT. Main Line) สะพานเดิมเป็น Box Culvert ขนาด ๓-๒.๗๐ x ๓.๐๐ เมตร แต่ตามแบบในคู่สัญญาเป็นสะพาน Plank Girder Span $(๑ \times ๙.๐๐) + (๑ \times ๗.๐๐) + (๑ \times ๖.๐๐) = ๒๒.๐๐$ เมตร
๓. สะพาน กม.๓๘+๑๑๙.๕๑๗ (LT. Main Line) สะพานเดิมเป็น Box Culvert ขนาด ๓-๒.๗๐ x ๓.๐๐ เมตร แต่ตามแบบในคู่สัญญาเป็นสะพาน Plank Girder Span $(๑ \times ๖.๐๐) + (๑ \times ๑๐.๐๐) + (๑ \times ๖.๐๐) = ๒๒.๐๐$ เมตร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ว่าจ้างแก้ไขแบบแปลนให้ถูกต้องตรงตามโครงสร้างสะพานเดิม และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิต่อขยายอายุสัญญา ตามข้อกำหนดในสัญญา ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวลิต แซ่ห่อ)
นายช่างโครงการ



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
Vichitbhan Construction Co., Ltd

โทรศัพท์ : -66(0)2314-4101-5
Telephone :
เทเล็กซ์ : 87653 VICHIT TH
Telex :
โทรสาร : -66(0)2315-0921
Telefax :

ที่ BV/DOH/๐๗๔/๒๕๖๘

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔
สายบางโหลง- แยกหนองไม้แดง
ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือย้ายสาธารณูปโภค
เรียน ชค.สท.๒ สายบางโหลง-แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖
อ้างถึง ๑. สัญญาที่ สท.๒/๔๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือที่ BV/DOH/๐๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔	
สายบางโหลง-แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖	
เลขที่รับ	129/2569
วันที่	20 ก.ค. 69
เวลา	10:30 น.

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักก่อสร้างทางที่ ๒ กรมทางหลวง เป็น“ผู้ว่าจ้าง” ได้ว่าจ้าง บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็น “ผู้รับจ้าง” ทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔ สายบางโหลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖ ระหว่าง กม.๓๖+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๙+๒๐๐.๐๐๐ รวม ระยะทางยาว ๓.๒๐๐ กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๖๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๗๕๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๘๘๙,๓๗๕.๐๐ บาทนั้น

ทั้งนี้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. นั้น ทางบริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าจ้างให้เร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการรื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้าที่เป็นอุปสรรคกีดขวางต่องานก่อสร้างท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทั้งฝั่ง ขาออกและขาเข้าโดยเร็ว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตามข้อกำหนดในสัญญา ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลาปฏิบัติงานตามเงื่อนไขแห่งสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวลิต แซ่ห่อ)
นายช่างโครงการ



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
Vichitbhan Construction Co., Ltd

โทรศัพท์ : +66(0)2314-4101-5
Telephone :
เทเล็กซ์ : 87653 VICHIT TH
Telex :
โทรสาร : +66(0)2315-0921
Telefax :

ที่ BV/DOH/๐๗๕/๒๕๖๘

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔
สายบางโหลง- แยกหนองไม้แดง
ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้เร่งรัดการประปาส่วนภูมิภาคหรือย้ายสาธารณูปโภค
เรียน ชค.สท.๒ สายบางโหลง-แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖
อ้างถึง ๑. สัญญาที่ สท.๒/๔๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือที่ BV/DOH/๐๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔	
สายบางโหลง-แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖	
เลขที่รับ	130 / 2569
วันที่	20 ก.ค. 69
เวลา	10:30 4-

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักก่อสร้างทางที่ ๒ กรมทางหลวง เป็น“ผู้ว่าจ้าง” ได้ว่าจ้าง บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็น “ผู้รับจ้าง” ทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔ สายบางโหลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖ ระหว่าง กม.๓๖+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๘+๒๐๐.๐๐๐ รวม ระยะทางยาว ๓.๒๐๐ กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๖๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๗๕๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๘๘๙,๓๗๕.๐๐ บาทนั้น

ทั้งนี้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. นั้น บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าจ้างให้เร่งรัดการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อน้ำประปาที่เป็นอุปสรรคกีดขวางต่องานก่อสร้างท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ทั้งฝั่งขาออกและขาเข้าโดยเร็ว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตามข้อกำหนดในสัญญา ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามเงื่อนไขแห่งสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวลิต แซ่ห่อ)

นายช่างโครงการ



บริษัท วิจิตรภานท์ก่อสร้าง จำกัด
Vichitbhan Construction Co., Ltd

โทรศัพท์ : -66(0)2314-4101-5
Telephone :
เทเล็กซ์ : 87653 VICHIT TH
Telcx :
โทรสาร : -66(0)2315-0921
Telefax :

ที่ BV/DOH/๐๗๖/๒๕๖๙

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔
สายบางโหลง- แยกหนองไม้แดง
ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอให้เร่งรัดหน่วยงานสื่อสารรื้อย้ายสาธารณูปโภค
เรียน ชค.สท.๒ สายบางโหลง-แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖
อ้างถึง ๑. สัญญาที่ สท.๒/๔๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือที่ BV/DOH/๐๖๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔	
สายบางโหลง-แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖	
เลขที่รับ	131/2569
วันที่	20 ก.ค. 69
เวลา	10:30 น.

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักก่อสร้างทางที่ ๒ กรมทางหลวง เป็น "ผู้ว่าจ้าง" ได้ว่าจ้าง บริษัท วิจิตรภานท์ก่อสร้าง จำกัด เป็น "ผู้รับจ้าง" ทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔ สายบางโหลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖ ระหว่าง กม.๓๖+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๙+๒๐๐.๐๐๐ รวมระยะทางยาว ๓.๒๐๐ กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๖๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๗๕๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๘๘๙,๓๗๕.๐๐ บาทนั้น

ทั้งนี้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. นั้น บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ว่าจ้างให้เร่งรัดหน่วยงานสื่อสารต่างๆ ดำเนินการรื้อย้ายสายส่งสัญญาณสื่อสารที่เป็นอุปสรรคกีดขวางต่องานก่อสร้างที่ระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทั้งฝั่งขาออกและขาเข้าโดยเร็ว โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตามข้อกำหนดในสัญญา ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามเงื่อนไขแห่งสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวลิต แชนท์)

นายช่างโครงการ

Thank You

Chaovalit Sae-Ho

081-753-7217

Line ID : 4102261432

E-Mail : bvbangvua@gmail.com

