



โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 34
สายบางโฉลง-แยกหนองไม้แดง
ตอนบางโฉลง-บางวัว ตอน 6
ช่วง กม.36+000-กม.39+200
ระยะทางประมาณ 3.200 กิโลเมตร

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ : สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

มูลค่าโครงการ : 759,750,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง : 960 วัน


ระยะเวลาที่เหลือ : 600 วัน (20 เดือน)

วันเริ่มต้นสัญญา : 23 สิงหาคม 2568

วันสิ้นสุดสัญญา : 8 เมษายน 2571



ที่ตั้งโครงการ
อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา

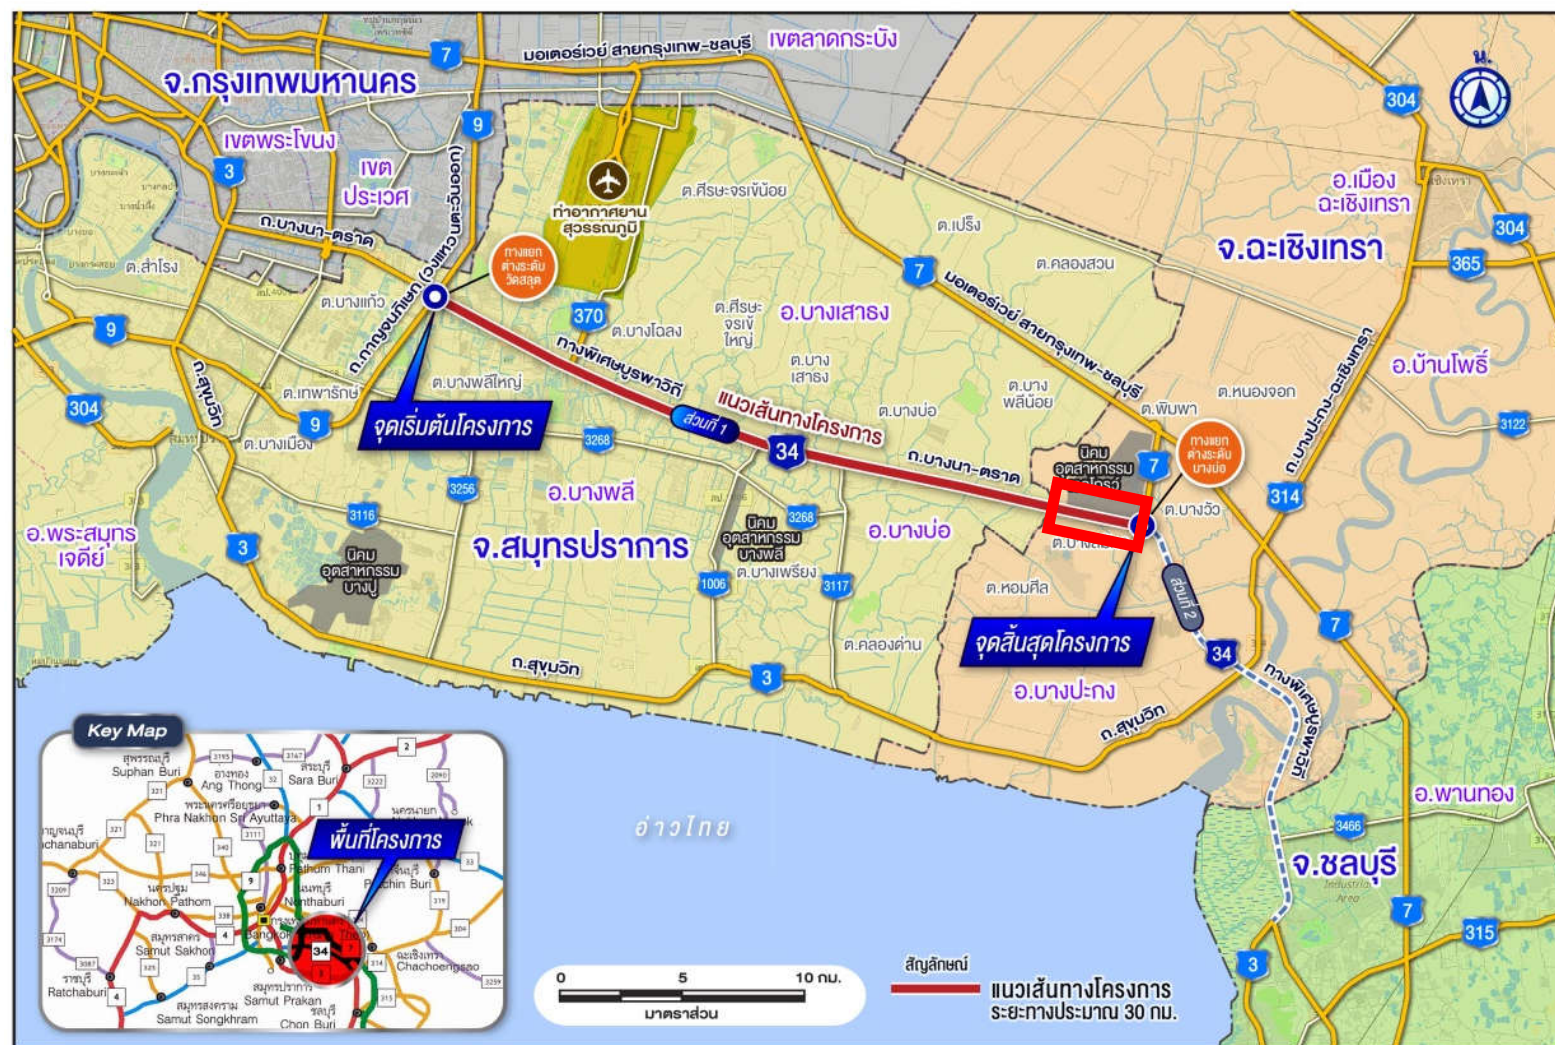

ความคืบหน้างานเตรียมการส่วนของบริษัทฯ



งานเตรียมการส่วนบริษัทฯ

- ♦ งานติดตั้ง Plant Concrete เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำ Mixed Design ครบเรียบร้อยแล้ว รออายุคอนกรีต 28 วัน
- ♦ งานติดตั้ง Plant Asphaltic งานติดตั้งแล้วเสร็จ รอชำระงวดที่ 5
- ♦ งานติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก อยู่ระหว่างปรับปรุงคุณภาพ
- ♦ งานติดตั้งรั้วรอบ Plant เหลือด้านปิด Plant Asphaltic

งานติดตั้ง Plant Concrete



งานติดตั้ง Plant Asphaltic

7



ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ


8

- ♦ งาน Remove Concrete Barrier & Pipe Culvert
- ♦ งาน Clearing And Grubbing
- ♦ งาน Milling of Existing Asphalt Concrete Surface
- ♦ งาน Sand Embankment
- ♦ งาน Soil Aggregate Subbase
- ♦ งาน Box Culvert Side Drain Side 1-1.20x1.20 m.
- ♦ งาน Retaining Wall Type 2A
- ♦ งาน Precast Manhole Type E For Box Culvert 1.20 m.

Remove Concrete Barrier & Pipe Culvert



Milling of Existing Asphalt Concrete Surface

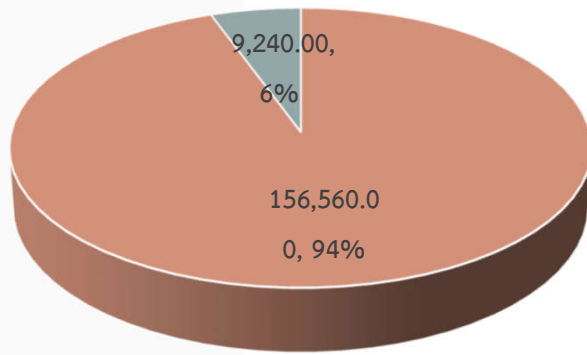

ปริมาณทั้งหมด
แล้วเสร็จ
คงเหลือ


165,800 ตร.ม.

9,240 ตร.ม.

156,560 ตร.ม.



Clearing And Grubbing

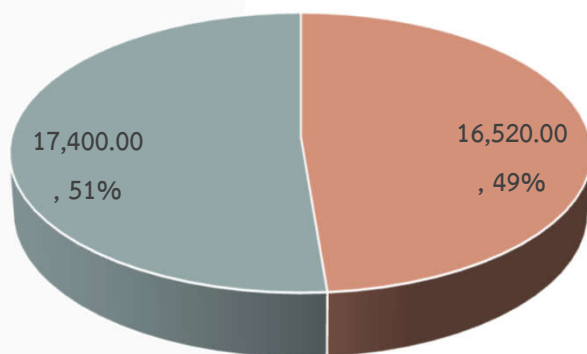


ปริมาณทั้งหมด
แล้วเสร็จ
คงเหลือ

33,920 ตร.ม.
17,400 ตร.ม.
16,520 ตร.ม.



Sand Embankment

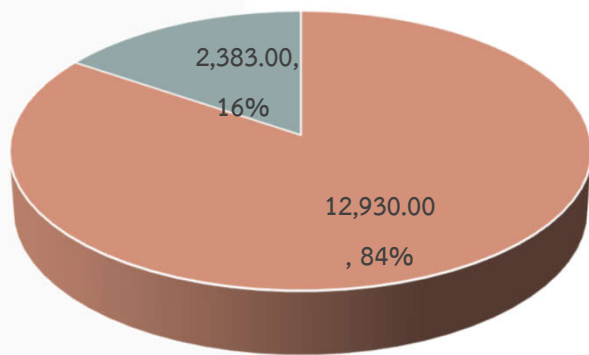


ปริมาณทั้งหมด
แล้วเสร็จ
คงเหลือ

15,313 ลบ.ม.
2,383 ลบ.ม.
12,930 ลบ.ม.



Soil Aggregate Subbase

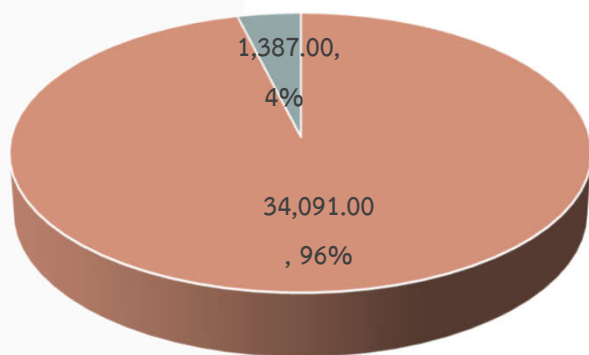


ปริมาณทั้งหมด
แล้วเสร็จ
คงเหลือ


35,478 ลบ.ม.

1,387 ลบ.ม.

34,091 ลบ.ม.

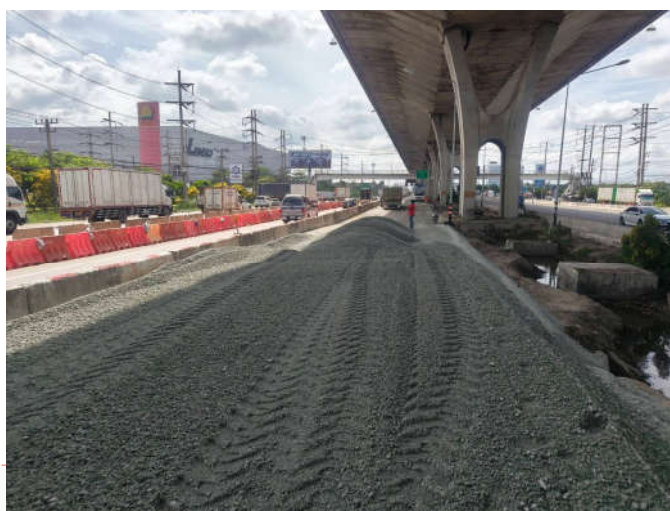


Box Culvert Side Drain Side 1-1.20x1.20 m.

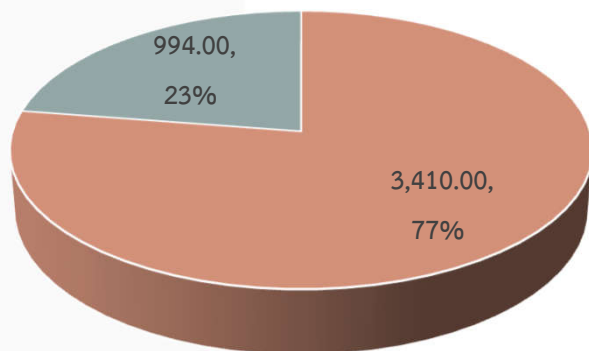


ปริมาณทั้งหมด	4,404 ม.
แล้วเสร็จ	994 ม.
คงเหลือ	3,410 ม.



สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งท่อเหลี่ยมขนาด 1.20 ม.

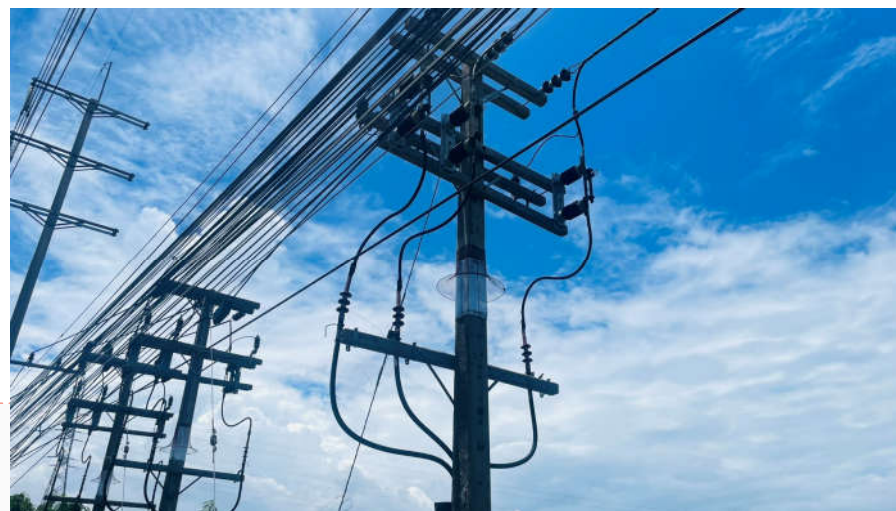

Retaining Wall Type 2A

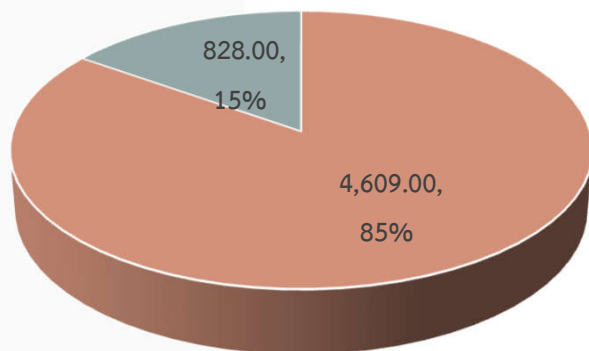


ปริมาณทั้งหมด
แล้วเสร็จ
คงเหลือ

5,437 m.
828 m.
4,609 m.



Precast Manhole Type E For Box Culvert 1.20 m.

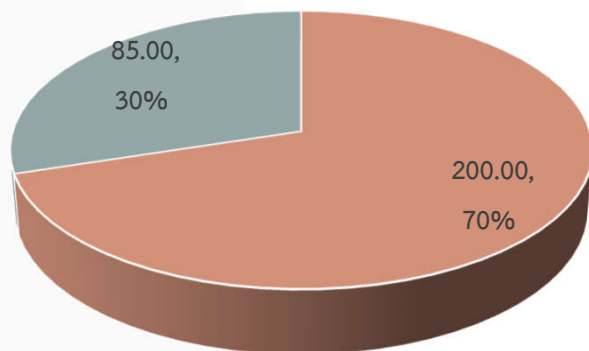

ปริมาณทั้งหมด
แล้วเสร็จ
คงเหลือ

285 Ea.

85 Ea.

200 Ea.



เรื่องแจ้งให้ทราบ

- ♦ ความก้าวหน้าโครงการ ผลงานสะสม 7.583% แผนสะสมงาน 21.45% ช้ากว่าแผนงาน **-13.867%** (ก.ค.69)
- ♦ เรื่องขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากวันหยุดเทศกาลส่งให้โครงการฯ รอสำนักอนุมัติและเซ็นสัญญาแก้ไขเพื่อปรับแผน
- ♦ ตามแผนงาน ผลงานสะสม จะน้อยกว่าแผนงานสะสม มากกว่า -15% ติดกันประมาณ 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.69)
- ♦ งานเบี่ยงจราจรเพื่องานก่อสร้าง
 - ♦ งานถนนเบี่ยงทางหลักฝั่งขาออก ได้ 2 ช่องจราจร ใช้ทางได้ 1 ช่องจราจร (ขยายทางเบี่ยงถึง กม.38+400)
 - ♦ งานสะพานบกปิดเบี่ยงได้ทั้งหมด แต่ต้องมีช่องจราจรสวนทาง (อยู่ระหว่างทำ Detour Road)
 - ♦ งานเบี่ยงถนนคู่ขนานฝั่งขาเข้า กม.38+100-39+200 (อยู่ระหว่างทำ Detour Road)
- ♦ งานเสาเข็มตอก (รอเอกสารใบสั่งซื้อเพื่อเริ่มผลิต)
- ♦ งานเสาเข็มเจาะ (รองงานเสาเข็มตอกเริ่มงาน)
- ♦ เครื่องชั่งน้ำหนักวัสดุ ช่างเชื่อมจาก สาย 5 เริ่มเข้าดำเนินการ
- ♦ Plant Asphaltic ยังขาดถึงเก็บน้ำยาง Prime Coat และถึงเก็บน้ำยาง Tack Coat
- ♦ เตรียมการเครื่องจักรงานปูยาง เพื่อเร่งความก้าวหน้าโครงการ

ปัญหาและอุปสรรค

- ♦ พนักงานที่เชี่ยวชาญ Plant Asphaltic เสียชีวิต และโพรแมน Plant ขอเกษียณอายุ
- ♦ โพรแมนงานโครงสร้าง เสียชีวิต งานสะพานเริ่มต้น ก.ย.69
- ♦ Plant Concrete เสียรอยจ่ายจัดซื้อสิ่งซื้ออะไหล่
- ♦ รถตัก สำหรับ Plant Concrete และ Plant Asphaltic ยังไม่มี
- ♦ พxr.รถชุด ขาด 2 ตำแหน่ง ,พxr.รถบรรทุก ขาด 2 ตำแหน่ง , พxr.รถเทรเลอร์ ขาด 1 ตำแหน่ง
- ♦ พนักงานตำแหน่ง พxr.รถผสมคอนกรีต และพxr.รถบรรทุกน้ำ ต้องขอรับเพิ่ม
- ♦ รถบรรทุกสิบล้อ มี 5 คัน ไม่เพียงพอ, รถผสมคอนกรีต มี 1 คัน ไม่เพียงพอ (รอเปลี่ยนยาง)
- ♦ เครื่องจักรงานถนนมี 1 ชุด ไม่เพียงพอในการทำงาน
- ♦ รถบริการอายุการใช้งานกว่า 10 ปี ต้องเปลี่ยนช่วงล่าง ,ระบบเบรกและคลัตช์ ,ยางรถยนต์ (ยังได้อะไหล่ไม่ครบ)
- ♦ เครื่องจักร เสียบ่อยครั้ง ต้องใช้เงินสต็อกซื้ออะไหล่ และต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องจักร (กรอง,เล็บ,ใบมีด,ยาง)

เพิ่มทรัพยากรเพื่อเร่งรัดงาน

20

- ♦ เพิ่มป้ายจราจรชั่วคราว อุปกรณ์จราจร Barrier พลาสติก ,กรวยยาง ,ไฟเตือน ,ไฟแสงสว่าง และสายไฟฟ้า
- ♦ เพิ่มเครื่องจักรงานถนน 1 ชุด (รถเกรดเดอร์ รถบด รถน้ำ) สำหรับงานขยายถนนทางหลักขาออก และคูขนานขาเข้า
- ♦ เพิ่มรถชุด 2 คัน สำหรับงานชุดเปิดถนนบางนาเพื่อทำสะพานบก ผึ่งขาออก และสำหรับเพิ่มกรรม.งานวางท่อผึ่งขาเข้า
- ♦ รถบรรทุกสิบล้อต้องมีครบ 10 คัน ตามแผน เพื่อรองรับงานชุดเปิดถนน ,งานชุดดินวางท่อ และรองรับงานปูยาง
- ♦ รถผสมคอนกรีตต้องมีครบ 4 คัน ตามแผน และรับพนักงานขับรถเพิ่ม
- ♦ เพิ่มรถปูยางแบบล้อยาง เพื่อช่วยปูงานหินคลุกผสมซีเมนต์ ลดภาระรถเกรดเดอร์ และสำรองงานปูยาง
- ♦ ปรับเวลาการทำงานของพนักงาน เป็นเวลา 7.00 น.-18.00 น.
- ♦ สรุปรู้รับเหมาเสาเข็มตอก และผู้รับเหมาเสาเข็มเจาะ เพื่อเริ่มงานให้เร็วที่สุด
- ♦ เพิ่มชุดผู้รับเหมาหรือเพิ่มคนงานผู้รับเหมาเดิม ให้รองรับงานสะพานบก ,งาน Curb&Gutter และ Barrier Type 1
- ♦ เร่งเอกสารประกอบกิจการของ Plant Asphaltic ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน
- ♦ เร่งซ่อมเครื่องจักรงานปูยาง หรือหาผู้รับเหมางานปูยางพร้อมเครื่องจักร
- ♦ งานปูยางสำหรับงานขยายถนน ต้องปูยางให้จบ 2 ชั้น (20 ซม.) จึงเบี่ยงจราจรกลับ

Thank You

Chaovalit Sae-Ho

081-753-7217

Line ID : 4102261432

E-Mail : bvbangvua@gmail.com





บริษัท วิจิตรภณท์ก่อสร้าง จำกัด
Vichitbhan Construction Co.,Ltd

ที่ BV/DOH/๐๘๓/๒๕๖๙

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔

สายบางโหลง- แยกหนองไม้แดง

ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖

๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอต่อย้ายอายุสัญญาช่วงวันหยุดเทศกาล

เรียน ชค.สท.๒ สายบางโหลง-แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖

อ้างถึง ๑. สัญญาที่ สท.๒/๔๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒. หนังสือที่ BV/DOH/๐๓๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙

๓. หนังสือที่ BV/DOH/๐๕๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔	
สายบางโหลง-แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖	
เลขที่รับ.....	141 / 2569
วันที่.....	๖ ส.ก. ๖9
เวลา.....	14:00 น.

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักก่อสร้างทางที่ ๒ กรมทางหลวง เป็น“ผู้ว่าจ้าง” ได้ว่าจ้าง บริษัท วิจิตรภณท์ก่อสร้าง จำกัด เป็น “ผู้รับจ้าง” ทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔ สายบางโหลง - แยกหนองไม้แดง ตอน บางโหลง-บางวัว ตอน ๖ ระหว่าง กม.๓๖+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๓๙+๒๐๐.๐๐๐ รวมระยะทางยาว ๓.๒๐๐ กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๖๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๗๕๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๘๙๙,๓๗๕.๐๐ บาท

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. นั้น ทางบริษัทฯ ขอต่อย้ายอายุสัญญาตามข้อกำหนดในสัญญา ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา และสิทธิในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(กรณีถ้ามี) รวมทั้งสิทธิอื่นใดตามเงื่อนไขแห่งสัญญา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอต่อย้ายอายุสัญญาในช่วงวันหยุดเทศกาลตามที่กรมทางหลวงขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้าง รวมทั้งหมด ๑๔ วัน ดังนี้

๑. ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน

๒. ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๗ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวลิต แซ่ห่อ)

นายช่างโครงการ
