

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ตอน 3 และ ตอน 4



งานก่อสร้างด้านวิศวกรรม ภาคสนาม

ปัญหา-อุปสรรค สำรวจ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
และต้นไม้



ปัญหา - อุปสรรค

1. งานแก้ไขแบบก่อสร้าง
 - 1.1 แก้ไขรูปแบบ **Pier Segment** (หล่อในที่) เป็นรูปแบบ **Precast box Segment**
 - 1.2 แก้ไขรูปแบบคานขวาง **Cross beam Type PM01, PM02, PM03** จากหล่อในที่เป็น **Precast**
2. ปัญหา-อุปสรรค สายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน ทำให้ **LG.** ไม่สามารถติดตั้งแผ่นพื้นสะพานได้ ตำแหน่ง **P40 STA.14+320.000**
3. ปัญหา-อุปสรรค ฐานรากโครงสร้างใหม่ ติดกอลอดใต้ดิน ท่อประปา $\varnothing$ 1000 มม. ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ ตำแหน่ง **P44 STA.14+470.000**
4. ฐานรากโครงสร้างใหม่ ติดสะพานลอย (โครงสร้างเดิม) จำนวน 2 จุด
5. กอลอด หน่วยงานต่างๆ **NT** ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว (หน่วยงานอื่นรอตรวจสอบเพิ่มเติม)



ปัญหา - อุปสรรค

6. ปัญหา-อุปสรรค ต้นไม้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างร่องกลาง

- ต้นข่อย	จำนวน	18	ต้น
- ต้นตีนเป็ด	จำนวน	4	ต้น
- ต้นพิทุล	จำนวน	154	ต้น
	รวม	176	ต้น

7. การจัดการจราจรพื้นที่ก่อสร้าง



งานจัดเตรียมงาน กรมทางหลวง

**อาคารสำนักงาน บ้านพัก อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ
(ตามสัญญา)**



เตรียมงานตามสัญญา

1. สำนักงานโครงการ และบ้านพัก กรมทางหลวง 3-4 (โครงการเน้นย้ำให้เสร็จ มิย.69)
ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า / ประปา / โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และเครื่องใช้สำนักงาน
2. บุคลากร/ยานพาหนะ รถยนต์ ตอน 3-4 (ก่อน NTP กย.69)
3. เครื่องมือ ตามสัญญาของกรมทางหลวง ตอน 3-4 (ก่อน NTP กย.69)
อุปกรณ์สำหรับงาน Asphaltic Concrete
อุปกรณ์สำหรับงาน Soil
อุปกรณ์สำหรับงาน Survey
4. IWZ ตอน 3-4 (60 วัน นับจาก NTP)

งานก่อสร้างสำนักงานและบ้านพักกรมทางหลวง ตอน 3



(โครงการเน้นย้ำให้จบ มีย.69)



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

งานก่อสร้างสำนักงานและบ้านพักกรมทางหลวง ตอน 3



(โครงการเน้นย้ำให้จบ มีย.69)



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

งานก่อสร้างสำนักงานและบ้านพักกรมทางหลวง ตอน 4



(โครงการเน้นย้ำให้จบ มีย.69)



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

งานก่อสร้างสำนักงานและบ้านพักกรมทางหลวง ตอน 4



(โครงการเน้นย้ำให้จบ มีย.69)



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ปัญหาและอุปสรรค

2. บุคลากร/ยานพาหนะ

11.3 จัดหายานพาหนะ

ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหารถยนต์ตรวจการณแบบ 5 ประตู จำนวน...1....คัน และรถปิกอัพตอนครึ่ง จำนวน.....5....คัน เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ หรือ ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า ที่มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รวมจำนวน.....6....คัน พร้อมประกันภัยน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และพนักงานขับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าล่วงเวลาของพนักงานขับ ทั้ง.....6.....คัน สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงใช้ในการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทางหรือสะพานตามสัญญาตั้งแต่วันที่เริ่มต้นสัญญาจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการทำงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงหรือกรมทางหลวง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามบัญชีสื่อน้ำมันงานเลขอาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0203/9212 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2527

ตารางสรุป ตำแหน่งพนักงานเฉพาะตามงานส่วนภูมิภาค

(ก่อน NTP กย.69)

ลำดับ	ตำแหน่ง	หน่วยงานกรม 34			รับเพิ่ม	วุฒิวิชาชีพ	หมายเหตุ
		จำนวนทั้งหมด	มี(จำนวน)	ขาด(จำนวน)	89		
	งานก่อสร้างทางหลวง						
	วิศวกรโครงการฯ	0					
A	วิศวกรโยธา	1	0	1	1	สามัญวิศวกร	ประจำสำนักงานตลอดเวลาการปฏิบัติงานโครงสร้าง เริ่มใช้หลังจาก NTP. เพื่อเริ่มมาก่อสร้างเสาเข็มจะ (สำคัญมาก)
B	วิศวกรโยธา	1	0	1	1	สามัญวิศวกร	เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องงานติดตั้ง Precast segment (Erection) LG
B	วิศวกรเครื่องกล	1	0	1	1	สามัญวิศวกร	เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องงานติดตั้ง Precast segment (Erection) LG
							เริ่มใช้หลังจาก NTP. ปฏิบัติงานโครงสร้างไปแล้ว ประมาณ 8 เดือน

มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงพิเศษ

๑. บุคลากร

- ๑.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนระหว่างการก่อสร้างจำนวนอย่างน้อย ๕ คน โดยต้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนระหว่างก่อสร้างอย่างน้อย ๑ คน ที่มีใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจความปลอดภัยทางถนน (ROAD SAFETY AUDITOR) ทำหน้าที่เป็นผู้รับรองผลตรวจสอบและรับรองรายงานความปลอดภัยระหว่างงานก่อสร้าง และรายงานผลต่อผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกสัปดาห์ เพื่อพิจารณาแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกทราบการปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นตามความเหมาะสม
- ๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ควบคุมงานก่อสร้าง ประจำอยู่ที่หน้างานตลอดช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
- ๑.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรถเครน (Mobile Crane) และเป็นเจ้าหน้าที่ประเภท และ พนักงานควบคุมเครื่องจักรหนัก ต้องผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาต ในการทำงานจากหน่วยงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้รับการรับรองให้ออกใบอนุญาต ทั้ง "ผู้บังคับ", "ผู้ควบคุม", "ผู้ให้สัญญาณ" และ "ผู้ถือเคาะวัสดุ" และแสดงใบอนุญาตต่อผู้แทนของผู้ว่าจ้างทุกครั้ง ที่นำรถเครนหรือปั้นจั่นเข้ามาปฏิบัติงานในที่ก่อสร้าง
- ๑.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีหน้าที่ควบคุมและบังคับ Launching Gantry (LG) ต้องมีความรู้ความชำนาญในระบบ ขั้นตอนการทำงาน การเคลื่อนที่ และระบบความปลอดภัยของ LG นั้น ๆ โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง
- ๑.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลจากวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกร กำกับ ตรวจสอบ และแนะนำ การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Launching Gantry (LG)
- ๑.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลจากวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร กำกับ ตรวจสอบ และแนะนำ การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งชิ้นส่วนที่บนสะพานสำเร็จรูป (Precast Segment)
- ๑.๗ ผู้รับจ้างจัดให้มีนักประชาสัมพันธ์ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ตามเงื่อนไขสัญญา

ปัญหาและอุปสรรค

3.เครื่องมือ ตามสัญญาของกรมทางหลวง

(ก่อน NTP กย.69)

ASPHALTIC

NO	รายการ	หน่วย	จำนวน ในส	จำนวน สัญญา	จัดหา เพิ่มเติม	หมายเหตุ
1	SIEVE 1 1/2"	EA	1	1	-	
2	SIEVE 1"	EA	1	1	-	
3	SIEVE 3/4"	EA	1	1	-	
4	SIEVE 1/2"	EA	1	1	-	
5	SIEVE 3/8"	EA	1	1	-	
6	SIEVE #4	EA	1	1	-	
7	SIEVE #8	EA	1	1	-	
8	SIEVE #10	EA	1	-	-	ไม่มีในสัญญา
9	SIEVE #16	EA	1	1	-	
10	SIEVE #20	EA	1	-	-	ไม่มีในสัญญา
11	SIEVE #30	EA	1	1	-	
12	SIEVE #40	EA	1	-	-	ไม่มีในสัญญา
13	SIEVE #50	EA	1	1	-	
14	SIEVE #100	EA	1	1	-	
15	SIEVE #200	EA	2	2	-	
16	PAN & COVER	EA	-	1	1	
17	MOTORIZED SEIVE SHAKER	EA	1	1	-	
18	SAMPLE SPLITTER 1"	EA	1	1	-	
19	SAMPLE SPLITTER 2"	EA	1	1	-	
20	ELECTRIC OVEN	EA	1	1	-	
21	STANDARD WATER BATH	EA	1	1	-	
22	Thermometer แบบแห้งแก้ว (200C)	EA	1	1	-	
23	METAL THERMOMETER 250C	EA	1	2	1	
24	ELECTRONIC BALANCE 2610 g.	EA	1	1	-	
25	ELECTRONIC BALANCE 20 kg.	EA	1	1	-	
26	HOT PLATE 200C	EA	1	1	-	
27	เตาแก๊ส พร้อมถังแก๊ส	EA	-	1	1	
28	COMPACTION PEDESTAL or MARSHALL COMPACTION	EA	1	1	-	
29	COMPACTION MOLD HOLDER	EA	1	1	-	
30	STABILITY COMPACTION MOLD	EA	15	15	-	

31	STABILITY COMPACTION HEMMER	EA	1	1	-	
32	STABILITY COMPACTION MACHINE	EA	1	1	-	
33	PROVING RING 10000 LBS	EA	1	-	-	หน่วยงานมี 10000 ปอนด์
34	PROVING RING 15000 LBS	EA	-	1	1	
35	ASPHALT FLOW INDICATOR	EA	1	1	-	
36	SAND EQUIVALENT APPARATUS	EA	1	1	-	
37	CENTRIFUGE EXTRACTOR	EA	1	1	-	
38	SAMPLE EXTRUDER	EA	1	1	-	
39	SPECIFIC GRAVITY of FINE AGGREGATE and ABSORPTION /	EA				
	SAND LAB ABSORPTION CONE	EA	1	1	-	
	VOLUMETRIC FLASK 500ml.	EA	2	2	-	
40	STABILITY MOLD	EA	1	1	-	
41	FLAKINESS INDEX	EA	1	1	-	
42	ELONGATION INDEX	EA	1	1	-	
43	SPATULA	EA	1	#	-	
44	SCOOP	EA	1	#	-	
45	VISCOSITY CUPS DIN 4mm.	EA	1	1	-	
46	เครื่องทดสอบการเจาะ PENETRATION	EA	1	1	-	

สรุปต้องจัดหาเพิ่มเติม

NO	รายการ	หน่วย	จำนวน ในสต็อก	จำนวน สัญญา	จัดหา เพิ่มเติม
1	PAN & COVER	EA	-	1	1
2	METAL THERMOMETER 250C	EA	1	2	1
3	เตาแก๊ส พร้อมถังแก๊ส	EA	-	1	1
4	PROVING RING 15000 LBS	EA	-	1	1

อุปกรณ์สำหรับงาน Asphaltic Concrete

ปัญหาและอุปสรรค

3.เครื่องมือ ตามสัญญาของกรมทางหลวง

LAB SOIL TEST

NO	รายการ	หน่วย	จำนวน ไนต	จำนวน สัญญา	จัดหา เพิ่มเติม	หมายเหตุ
1	MECHANICAL LOADING PRESS เครื่องกด CBR	EA	1	1	-	
2	STANDARD LIQUID LIMIT DEVICE เครื่องมือหาความชื้นของมวล	EA	1	1	-	
3	MOTORIZED SIEVE SHAKER เครื่องตยาตะแกรงร่อน	EA	1	1	-	
4	DOUBLE WALL OVEN (capacity not less than 80 DMP)	EA	1	1	-	
5	ELECTRONIC BALANCE 311 g	EA	1	1	-	
6	ELECTRONIC BALANCE 2610 g	EA	1	1	-	
7	ELECTRONIC BALANCE 35 LBS or 16 kg.	EA	1	1	-	
8	ELECTRONIC BALANCE 20 kg.	EA	1	1	-	
9	HYDRAULIC EJECTOR เครื่องยกตัวอย่าง	EA	-	1	1	04/1/2029 โอนไปภาค
10	C.B.R MOLD แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต	EA	15	21	6	
11	SWELL PLATE แผ่นวัดการบวมของดิน	EA	15	21	6	
12	SURCHARGE WEIGHT แผ่นถ่วงน้ำหนัก	EA	39	63	24	
13	SPACER DISC แผ่นโลหะรอง	EA	1	1	-	
14	TRIPOD ATTACHMENT สามขาติดการบวมตัว	EA	1	1	-	
15	DIAL INDICATOR for PROVING RING	EA	0	3	3	
16	SWELL DIAL INDICATOR นาฬิกาวัดการบวมเทียบ	EA	1	2	1	
17	PROVING RING 10000 LBS + DIAL INDICATOR	EA	1	1	-	
18	PROVING RING 6000 LBS + DIAL INDICATOR	EA	1	1	-	
19	PROVING RING 2000 LBS + DIAL INDICATOR	EA	1	1	-	
20	PISTON รีดดิน	EA	1	1	-	
21	STANDARD COMPACTION HEMMER	EA	1	1	-	
22	MODIFIED COMPACTION HEMMER	EA	1	1	-	
23	ALUMINIUM CAN 3"	EA	60	120	60	
24	STD COMPACTION MOLD	EA	2	2	-	
25	FIELD DENSITY TEST SET	EA	5	5	-	
26	RUBBER MALLET	EA	1	1	-	
27	SAND SCOOP เล็ก	EA	1	2	1	
28	SAND SCOOP ใหญ่	EA	1	2	1	
29	FLEXIBLE SPATULA	EA	2	2	-	
30	GRADUATED CYLINDER 100 CC.	EA	1	1	-	
31	GRADUATED CYLINDER 1000 CC.	EA	1	1	-	
32	ALUMINIUM CAN 2"	EA	24	24	-	
33	SIEVE 2"	EA	1	1	-	

34	SIEVE 1 1/2"	EA	1	1	-	
35	SIEVE 1"	EA	1	1	-	
36	SIEVE 3/4"	EA	2	2	-	
37	SIEVE 1/2"	EA	1	1	-	
38	SIEVE 3/8"	EA	1	1	-	
39	SIEVE #4	EA	2	2	-	
40	SIEVE #8	EA	1	1	-	
41	SIEVE #10	EA	1	1	-	
42	SIEVE #16	EA	1	1	-	
43	SIEVE #20	EA	2	2	-	
44	SIEVE #30	EA	1	1	-	
45	SIEVE #40	EA	1	2	1	
46	SIEVE #50	EA	1	1	-	
47	SIEVE #100	EA	1	1	-	
48	SIEVE #200	EA	2	2	-	
49	PAN & COVER	EA	1	1	-	
50	SAMPLE SPLITTER 1"	EA	1	1	-	
51	SAMPLE SPLITTER 2"	EA	1	1	-	
52	ถาดโลหะตากตัวอย่างหนา 1.6 มม. ไม่ต่ำกว่า 0.60x1.00x0.10 ม.	EA	4	10	6	
53	ถาดโลหะตากตัวอย่างหนา 1.6 มม. ไม่ต่ำกว่า 0.60x0.60x0.10 ม.	EA	-	4	4	
54	CONCRETE CORE DRILLING MACHINE เครื่องเจาะคอนกรีต	EA	1	1	-	

สรุปต้องจัดหาเพิ่มเติม

NO	รายการ	หน่วย	จำนวน ไนต	จำนวน สัญญา	จัดหา เพิ่มเติม
1	HYDRAULIC EJECTOR เครื่องยกตัวอย่าง	EA	-	1	1
2	C.B.R MOLD แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต	EA	15	21	6
3	SWELL PLATE แผ่นวัดการบวมของดิน	EA	15	21	6
4	SURCHARGE WEIGHT แผ่นถ่วงน้ำหนัก	EA	39	63	24
5	DIAL INDICATOR for PROVING RING	EA	-	3	3
6	SWELL DIAL INDICATOR นาฬิกาวัดการบวมเทียบ	EA	1	2	1
7	ALUMINIUM CAN 3"	EA	60	120	60
8	SAND SCOOP เล็ก	EA	1	2	1
9	SAND SCOOP ใหญ่	EA	1	2	1
10	SIEVE #40	EA	1	2	1
11	ถาดโลหะตากตัวอย่างหนา 1.6 มม. ไม่ต่ำกว่า 0.60x1.00x0.10 ม.	EA	4	10	6
12	ถาดโลหะตากตัวอย่างหนา 1.6 มม. ไม่ต่ำกว่า 0.60x0.60x0.10 ม.	EA	-	4	4

อุปกรณ์สำหรับงาน Soil

3.เครื่องมือ ตามสัญญาของกรมทางหลวง

(ก่อน NTP กย.69)

SURVEY						
NO	รายการ	หน่วย	จำนวน ในสต็อก	จำนวน สัญญา	จัดหา เพิ่มเติม	หมายเหตุ
1	กล้องประมวลผล TOTAL STATION VS-HQA46700 NIKON 2"	SET	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
	LHION LONG-LIFE BATTERIES	EA	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
	CLIP-ON BATTERY HOLDER	EA	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
	UNIVERSAL CHARGER POWER CARD AND ADAPTER	EA	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
	TRIBRACH LENS CAP PLUMB BOB	EA	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
	PLASTIC CARRYING CASE	EA	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
	INSTRUCTION MANUAL	EA	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
	PROGRAM TRANSIT WITH D89 CABLE AND USB CABLE	EA	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
	ALUMINIUM TRIPOD VS-GAT-OL	SET	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
2	SINGLE PRISM SET VK-PRISM SET	SET	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
3	SINGLE PRISM SET VK-PRISM SET	SET	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
4	SINGLE PRISM PILE 2M VK-PRISM POLE	SET	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
5	NIKON AUTOMATIC LEVEL MODEL AP-8 28X	SET	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
	ALUMINIUM TRIPOD	EA	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
	SLIDE ALUMINIUM STAFF 3 M	EA	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
	UMBRELLA SCENE NIKON 30'	EA	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
	UMBRELLA SCENE NIKON 36'	EA	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
	UMBRELLA STAND	EA	-			039/1914 ลว.1-8-68 โอนบางบัว
						ต้องจัดการใหม่ทั้งหมด

เนื่องจากของเดิมที่ใช้ในหน่วยงานบ้านแพ้ว ตอน 3 ได้มีการโอนไปให้หน่วยงานบางวัว

ปัญหาและอุปสรรค

(หลัง NTP 60 วัน)

4. IWZ ตอน 3-4 ตามสัญญาของกรมทางหลวง

อุปกรณ์ติดตั้งด้านจราจร

องค์ประกอบของระบบ Traffic Safety in Work Zone

ระบบประมาณระยะเวลากการเดินทาง



1

ระบบนำขบวนเปลี่ยนข้อความ



2

ระบบกล้องวงจรปิด




3

ระบบเก็บข้อมูลปริมาณจราจร



4

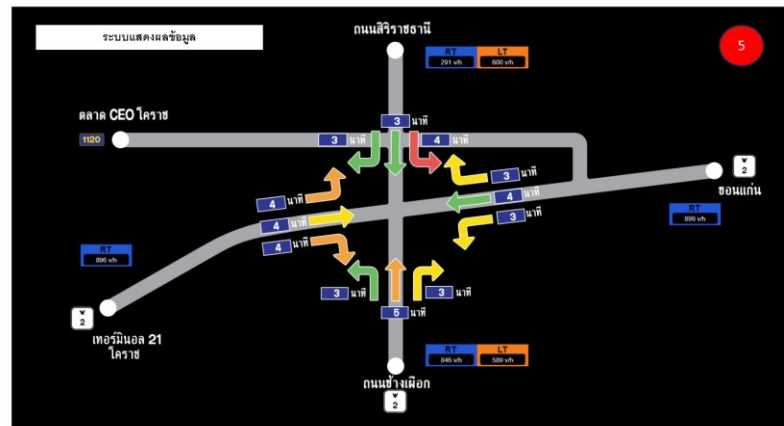

การเตรียมงาน VCB-V&K

อาคารสำนักงาน บ้านพัก และอื่นๆ



เร่งดำเนินงาน

1. สำนักงานและบ้านพัก VCB – V&K
2. เตรียมงานโครงม่าน ช่อม ทาสี
3. ขนย้าย Concrete Barrier ไปสต็อก หน่วยงานบสมฯ
4. หาพื้นที่เช่า เพื่อใช้ปฏิบัติงานและจัดเก็บทรัพย์สิน
5. ตั้งปั๊มหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ศูนย์ซ่อมเครื่องจักร สาย 5)
6. งานรื้อ Lg. เครื่องจักร
7. เครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรม

1. งานก่อสร้างสำนักงานและบ้านพัก VCB – V&K




1. งานก่อสร้างสำนักงานและบ้านพัก VCB – V&K



1. งานก่อสร้างสำนักงานและบ้านพัก VCB – V&K



2. เตรียมงานโครงบ้าน คัด ตัด ซ่อม

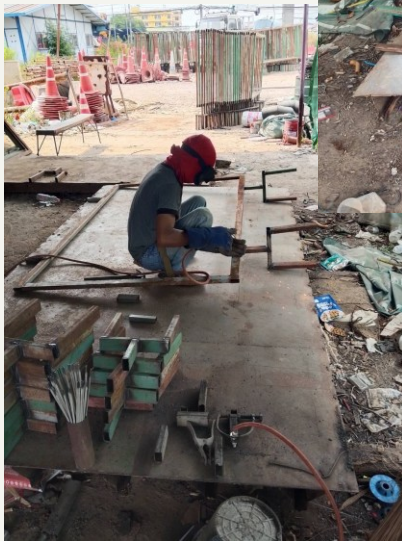

2. เตรียมงานโครงบ้าน ทาสี




2. ขนย้าย โครงงาน ไปสต็อก หน่วยงานบรมฯ



3. ขนย้าย Concrete Barrier ไปติดตั้ง หน่วยงานบรมฯ



4. พื้นที่ก่อสร้างไม่เพียงพอ

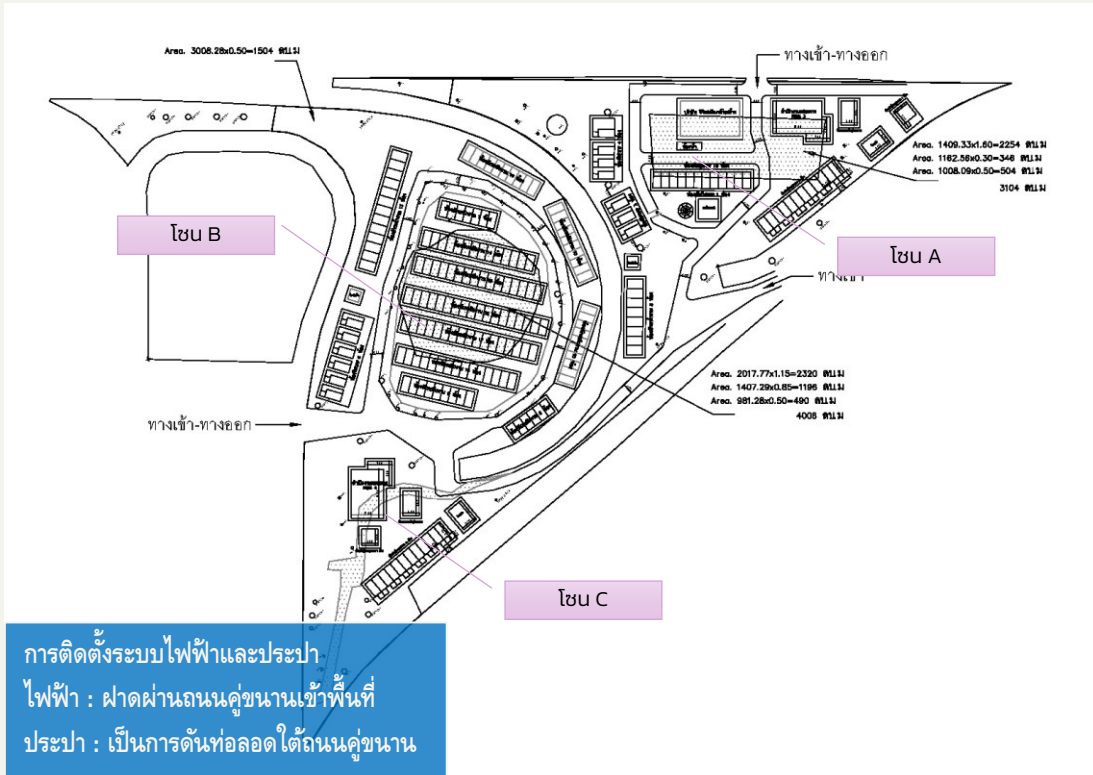

1. ไม่มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บ ทรัพย์สิน (อุปกรณ์และแบบ เหล็กต่างๆ)
2. ไม่มีพื้นที่สำหรับทำ Yard ประกอบแบบ เก็บสต็อกวัสดุ ก่อสร้าง งานเข็มเจาะ, กองส ต็อกดิน และงานหล่อชิ้นงาน Precast concrete
3. ไม่มีพื้นที่สำหรับก่อสร้างที่พัก อาศัย ให้ผู้รับเหมาช่วงค่าแรง

พิจารณาเพิ่มพื้นที่ 1 แปลง ไม่น้อย 5 ไร่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานส่วน นี้ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับ แผนงานก่อสร้าง

โครงการ ส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี)

ตอนพุทธมณฑล สาย 3 - พุทธมณฑล สาย 4 ตอน 3 และ ตอน 4




5. ตั้งปั๊มหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ณ ศูนย์ซ่อมสาย 5)



◀ ถังพร้อมหัวจ่าย ขนาด 15,000 ลิตร



6. งานรื้อ Lg. ตอน 4 บ.กรุงธน (รื้อย้ายจบเรียบร้อยแล้ว)

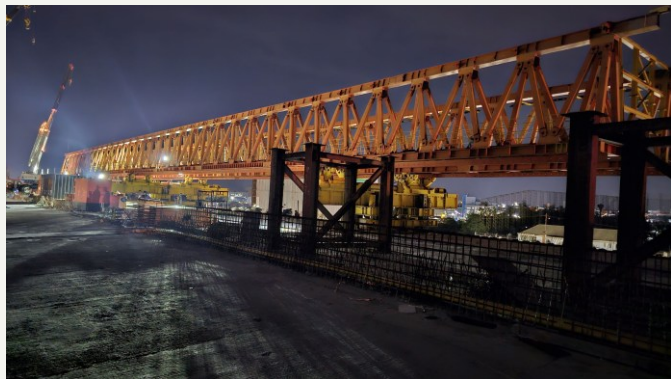

7. เครื่องจักร

- พลส. เน้นย้ำ ให้ทางบริษัทฯ เตรียมเครื่องจักรให้พร้อมก่อน โดยจะให้เจ้าหน้าที่กรมทางตรวจสอบก่อน เริ่ม **NTP 1** เดือน อาทิ รถเจาะเข็ม รถบรรทุกสิบล้อ แบ็คโฮ (ช่วงเดือน กย.2569)

ลำดับ	รายการ	จำนวนตามแผน	แผนการใช้เครื่องจักร (เดือน)																																				หมายเหตุ		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
A	Lifting Equipment																																								
1	100-400ton crane																																								
2	60ton crane	3						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	50ton crane	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	25ton crane	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
5	5ton truck crane	5	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
6	25ton Trailer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
B	Earthwork Equipment																																								
1	Hydraulic Excavator PC200	5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
2	Hydraulic Excavator equiped Beeler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3	Hydraulic Excavator PW100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4	Motor Grader	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5	Air Compressor	4					2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
6	Generator 125 KVA	4					2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
7	Bulldozer D4H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
8	10Wheels dump truck	8	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
9	Water truck	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
10	Fuel truck	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
11	รถเจาะ	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
12	Concrete pump	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13	Vibration Roller Compactor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

ขาด 2 คัน
ขาด 1 คัน
ขาด 1 คัน
ขาด 4 เครื่อง
ขาด 2 เครื่อง
ขาด 1 คัน
ขาด 6 คัน
ขาด 1 คัน
ขาด 1 คัน
ขาด 1 คัน

ปัญหา - อุปสรรค

1. เครื่องจักรงานถนน รถเกรด รถบดสันสะท้อน ใช้ในการปรับพื้นที่และถนนในโครงการฯ
2. ฝากเรื่องค่าใช้จ่ายการดำเนินการไฟฟ้าในโครงการ ขยายเขตเข้าแคมป์
 1. ส่วนของหน่วยงานการไฟฟ้า
 2. ส่วนของผู้รับเหมา บ.สตาร์พาวเวอร์
3. ติดตามงานเข็มเจาะ สรุปล้างจ้างบริษัทใด
4. วัสดุก่อสร้าง ส่วนที่เหลือ ตู้คอนเทนเนอร์ สิ้นเปลืองซีเมนต์ หน้าต่าง
5. ฝากเรื่องเงินสดย่อย หน่วยงานฯ

จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ

